



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Piano di Qualifica

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	2.2.0
Redattori	Eleonora Bellet, Alex Oloni, V.Y. Kaneda Fernandes
Verificatori	Eleonora Bellet, Diego Belluz, V.Y. Kaneda Fernandes
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	06/07/2026

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
2.3.0	14/08/2026	Aggiunto decimo sprint (fase PB) al cruscotto di qualità e alle azioni di miglioramento	Angela Maule	Alex Oloni	-
2.2.0	14/08/2026	Aggiunti ottavo e nono sprint (fase PB) al cruscotto di qualità, separazione dell'analisi RTB/PB e delle azioni di miglioramento	Angela Maule	Alex Oloni	-
2.1.0	06/07/2026	Aggiunto settimo sprint	Diego Belluz	Alex Oloni	-
2.0.0	24/06/2026	Approvazione e rilascio versione completa della fase RTB			Eleonora Bellet
1.1.0	21/06/2026	Estensione dei test e tracciamento requisiti aggiornati (v2.0.0 AdR)	V.Y. Kaneda Fernandes	Diego Belluz	-
1.0.1	15/06/2026	Inserimento consuntivi Sprint 5 e Sprint 6 nel cruscotto di qualità	V.Y. Kaneda Fernandes	Leonardo Soligo	-
1.0.0	28/05/2026	Approvazione versione 1.0.0			Eleonora Bellet
0.6.0	28/05/2026	Aggiunta sezione 6 - Iniziative di miglioramento.	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.5.2	28/05/2026	Correzione applicabilità metriche MPC-CC e MPC-TSR.	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.5.1	17/05/2026	Aggiornamento metriche RSI, PRI, TE, LE e ricalcolo QMS.	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.5.0	17/05/2026	Aggiunta sezione 5 - Cruscotto di qualità	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.4.3	15/05/2026	Test di accettazione e tabelle di tracciamento	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.4.2	14/05/2026	Test di sistema - qualità e vincolo	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.4.1	13/05/2026	Test di sistema - funzionali	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.4.0	12/05/2026	Aggiunta sezione 4 - Metodi di testing	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.3.2	09/05/2026	Correzioni soglie metriche MPC e MPD	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.3.1	08/05/2026	Aggiunta metriche MPD per usabilità, mantenibilità e portabilità	Alex Oloni	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.3.0	07/05/2026	Aggiunta sezione 3 - Qualità di prodotto	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.2.1	05/05/2026	Aggiunta metriche MPC per processi organizzativi	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.2.0	03/05/2026	Aggiunta sezione 2 - Qualità di processo	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.1.1	01/05/2026	Completamento riferimenti normativi e informativi	Alex Oloni	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.1.0	29/04/2026	Prima stesura del documento	Alex Oloni	V.Y. Kaneda Fernandes	-

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Finalità del documento	4
1.2	Glossario	4
1.3	Riferimenti	4
1.3.1	Riferimenti normativi	4
1.3.2	Riferimenti informativi	5
2	Qualità di processo	5
2.1	Processi primari	6
2.1.1	Fornitura	6
2.1.2	Sviluppo	6
2.2	Processi di supporto	6
2.2.1	Documentazione	6
2.2.2	Verifica	7
2.2.3	Gestione della qualità	7
2.3	Processi organizzativi	7
2.3.1	Gestione dei processi	7
3	Qualità di prodotto	7
3.1	Funzionalità	8
3.2	Affidabilità	8
3.3	Efficienza	8
3.4	Usabilità	8
3.5	Mantenibilità	9
3.6	Portabilità	9
4	Metodi di testing	9
4.1	Copertura del codice	9
4.2	Test unitari	9
4.3	Test di integrazione	10
4.4	Test di regressione	10
4.5	Test di sistema	10
4.6	Test di accettazione	19
4.7	Tracciamento	21
5	Cruscotto di qualità	23
5.1	Processi primari — Fornitura	24
5.1.1	MPC-EV e MPC-PV — Earned Value e Planned Value	24
5.1.2	MPC-AC — Actual Cost	25
5.1.3	MPC-CPI e MPC-SPI — Cost Performance Index e Schedule Performance Index	27
5.1.4	MPC-EAC e MPC-ETC — Estimated At Completion e Estimate To Complete	28

5.1.5	MPC-TEAC — Time Estimate At Completion	29
5.2	Processi primari — Sviluppo	31
5.2.1	MPC-RSI — Requirements Stability Index	31
5.3	Processi di supporto — Documentazione	32
5.3.1	MPC-IG — Indice di Gulpease	32
5.3.2	MPC-CO — Correttezza ortografica	33
5.4	Processi di supporto — Verifica	34
5.4.1	MPC-CC e MPC-TSR — Code Coverage e Test Success Rate . . .	34
5.5	Processi di supporto — Gestione della qualità	34
5.5.1	MPC-QMS — Quality Metrics Satisfied	34
5.6	Processi organizzativi — Gestione dei processi	38
5.6.1	MPC-TE — Time Efficiency	38
5.6.2	MPC-PRI — Percentuale Rischi Inattesi	38
5.6.3	MPC-LE — Labor Efficiency	40
6	Iniziative di miglioramento	40
6.1	Miglioramento della pianificazione e del controllo dei costi	42
6.2	Miglioramento della gestione dei rischi	43
6.3	Miglioramento della qualità documentale	44
6.4	Miglioramento del tracciamento operativo	45
6.5	Miglioramento della verifica e del testing	46

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento, denominato *Piano di Qualifica*^G, ha lo scopo di definire le strategie, le procedure e le metriche adottate dal gruppo *aLittleByte* per garantire la qualità del prodotto software e dei processi produttivi relativi al progetto C5 (NEXUM^G), proposto dall'azienda *Eggon*.

In particolare, questo documento si prefigge di:

- **Definire gli obiettivi di qualità:** specificare i target qualitativi per il processo di sviluppo (efficienza, stabilità) e per il prodotto software (funzionalità, affidabilità, manutenibilità), in conformità con gli standard ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 9126;
- **Identificare le metriche:** selezionare gli indicatori quantitativi più idonei per monitorare il raggiungimento degli obiettivi, fissando per ciascuno le soglie di accettazione e di ottimalità;
- **Pianificare le attività di verifica e validazione:** descrivere le metodologie di test (unità, integrazione, sistema, accettazione) e le procedure di analisi statica^G del codice e della documentazione;
- **Monitorare l'andamento del progetto:** fornire un resoconto puntuale delle misurazioni effettuate durante le varie fasi del ciclo di vita, permettendo al team di individuare tempestivamente criticità e attuare azioni correttive.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e garantire una comprensione uniforme della terminologia utilizzata, è stato redatto un documento esterno denominato *Glossario*^G. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con un significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati nel testo da una "G" in apice (es. parola^G). La loro definizione completa è consultabile nel *Glossario*^G.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato^G d'appalto C5 - NEXUM^G (Eggon):**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
Data Ultimo accesso: 15/06/2026
- **Norme di Progetto^G v1.0.0:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Norme%20di%20Progetto/Norme%20di%20Progetto.pdf>
Data Ultimo accesso: 15/06/2026

- **Regolamento del progetto didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Data Ultimo accesso: 15/06/2026
- **Piano di Progetto^G v2.1.0:**
 Documento interno del gruppo *aLittleByte*.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Piano%20di%20Progetto/Piano%20di%20Progetto.pdf>
Data Ultimo accesso: 15/06/2026

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario^G v2.0.0:**
 Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Glossario/Glossario.pdf>
Data Ultimo accesso: 15/06/2026
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**
Information technology – Software life cycle processes.
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
Data Ultimo accesso: 15/06/2026
- **Standard ISO/IEC 9126:**
Software engineering – Product quality.
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
Data Ultimo accesso: 15/06/2026
- **Slide T07 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
Data Ultimo accesso: 15/06/2026
- **Slide T08 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
Data Ultimo accesso: 15/06/2026

2 Qualità di processo

La qualità di processo descrive quanto le attività di sviluppo siano pianificate, controllate e migliorate nel tempo. Il riferimento metodologico adottato è lo standard ISO/IEC 12207, adattato al Way of Working^G del gruppo. Le metriche di qualità del processo misurano l'efficacia, l'efficienza e il controllo delle attività necessarie per sviluppare, gestire e consegnare il prodotto software. Il loro scopo è di monitorare l'aderenza alla pianificazione^G, la stabilità dei processi, la sostenibilità dei costi e il miglioramento costante dei risultati. Queste metriche non valutano il prodotto finito, ma il modo in cui il prodotto viene

realizzato. Il monitoraggio continuo consente di confrontare i valori rilevati con le soglie stabilite, garantendo trasparenza verso i committenti e coerenza interna nelle scelte operative.

In questo documento, tali misure vengono identificate tramite la sigla **MPC** (Metriche di Processo e Controllo). Questo identificativo permette di classificare e tracciare tutte le misurazioni relative alla gestione dei costi, all'avanzamento temporale, alla qualità della documentazione e all'efficienza dei processi interni al team di sviluppo.

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-EV	Earned Value	≥ 0	$\leq \text{EAC}$
MPC-PV	Planned Value	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-AC	Actual Cost	≥ 0	$\leq \text{EAC}$
MPC-CPI	Cost Performance Index	$\geq 0,9$	1
MPC-SPI	Schedule Performance Index	$\geq 0,9$	1
MPC-EAC	Estimated At Completion	$\pm 5\%$ rispetto al BAC	BAC
MPC-ETC	Estimate To Complete	≥ 0	$\leq \text{EAC}$
MPC-TEAC	Time Estimate At Completion	≥ 0	$\leq \text{Durata pianificata}$

Tabella 2: Valori per misurare la qualità della fornitura.

2.1.2 Sviluppo

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-RSI	Requirements Stability Index	$\geq 70\%$	100%

Tabella 3: Valori per misurare la qualità dello sviluppo.

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-IG ^G	Indice di Gulpease ^G del documento	≥ 60	≥ 80
MPC-CO	Correttezza ortografica	0 errori	0 errori

Tabella 4: Valori per misurare la qualità della documentazione.

2.2.2 Verifica

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-CC	Code Coverage	$\geq 80\%$	100%
MPC-TSR	Test Success Rate	100%	100%

Tabella 5: Valori per misurare la qualità della verifica.

2.2.3 Gestione della qualità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-QMS	Quality Metrics Satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 6: Valori per misurare la qualità della gestione della qualità.

2.3 Processi organizzativi

2.3.1 Gestione dei processi

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-TE	Time Efficiency	$\geq 50\%$	100%
MPC-PRI	Percentuale Rischi Inattesi	$\leq 20\%$	0%
MPC-LE	Labor Efficiency	$\geq 70\%$	$\geq 100\%$

Tabella 7: Valori per misurare la qualità della gestione dei processi.

3 Qualità di prodotto

La qualità di prodotto misura le proprietà interne ed esterne del software finale. Lo standard di riferimento è ISO/IEC 9126, adottato come base per definire le metriche di prodotto. Tali metriche consentono di verificare che il sistema rispetti i requisiti e che l'esperienza d'uso risulti stabile e prevedibile nelle condizioni operative attese.

In questo documento, tali misure vengono identificate tramite la sigla **MPD** (Metriche di Prodotto). Questo identificativo permette di classificare e monitorare le caratteristiche del software, facilitando la verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi prefissati.

3.1 Funzionalità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD02	Requisiti opzionali soddisfatti	0%	100%
MPD03	<u>AI</u> ^G Acceptance Rate (<u>rating</u> ^G $\geq 3/5$)	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$

Tabella 8: Valori per misurare la qualità delle funzionalità.

3.2 Affidabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD04	<u>Branch</u> ^G Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$
MPD05	Defect Density	$\leq 3 / \text{KLOC}^G$	$\leq 1 / \text{KLOC}^G$

Tabella 9: Valori per misurare la qualità dell'affidabilità.

3.3 Efficienza

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD06	<u>Latenza</u> ^G interfaccia utente	$\leq 2 \text{ sec}$	$\leq 0,5 \text{ sec}$
MPD07	<u>Latenza</u> ^G generazione testo <u>AI</u> ^G Assistant	$\leq 5 \text{ sec}$	$\leq 3 \text{ sec}$
MPD08	<u>Latenza</u> ^G generazione immagine <u>AI</u> ^G Assistant	$\leq 10 \text{ sec}$	$\leq 5 \text{ sec}$
MPD09	<u>Latenza</u> ^G analisi documentale <u>AI</u> ^G Co-Pilot	$\leq 10 \text{ sec}$	$\leq 5 \text{ sec}$

Tabella 10: Valori per misurare la qualità dell'efficienza.

3.4 Usabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD10	Profondità Massima di Navigazione	$\leq 5 \text{ livelli}$	$\leq 3 \text{ livelli}$
MPD11	Learning Time (funzioni principali)	$\leq 30 \text{ min}$	$\leq 15 \text{ min}$

Tabella 11: Valori per misurare la qualità dell'usabilità.

3.5 Mantenibilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD12	Code Smell	≤ 5	0
MPD13	Coefficient of Coupling	$\leq 0,7$	$\leq 0,4$
MPD14	Cyclomatic Complexity (per metodo)	≤ 15	≤ 10

Tabella 12: Valori per misurare la qualità della mantenibilità.

3.6 Portabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD15	Compatibilità Cross-Browser	$\geq 80\%$	100%

Tabella 13: Valori per misurare la qualità della portabilità.

4 Metodi di testing

La presente sezione descrive le attività di testing adottate nel progetto e le metriche utilizzate per valutare l'efficacia del processo di verifica. Le attività di testing forniscono evidenza oggettiva del corretto funzionamento dell'intero sistema e supportano la valutazione delle metriche di qualità del prodotto discusse in questo documento.

I test avranno un codice univoco, la descrizione, il requisito di riferimento e lo stato attuale. I codici per descrivere gli stati dei test sono i seguenti:

- **NI:** Non Implementato
- **I:** Implementato, ma non ancora verificato
- **S:** Superato, ovvero il test è stato eseguito ed ha restituito un esito positivo
- **NS:** Non Superato, ovvero il test è stato eseguito ma ha restituito un esito negativo

4.1 Copertura del codice

La copertura del codice (Code Coverage) misura la percentuale di codice sorgente eseguita durante l'esecuzione dei test automatici. Tale metrica consente di valutare il grado di verifica del software ed è direttamente collegata alla metrica **MPC-CC**. Il valore minimo accettabile è fissato all'80%.

4.2 Test unitari

I test unitari verificano il corretto funzionamento delle singole unità software in isolamento. L'attenzione è rivolta alle componenti critiche del backend: logica di elaborazione dei prompt^G, validazione degli input, gestione dei metadati^G documentali e algoritmi

di classificazione AI^G. I test sono realizzati con il framework Pest^G e contribuiscono al miglioramento delle metriche **MPC-TSR** e **MPC-CC**.

4.3 Test di integrazione

I test di integrazione^G verificano il corretto comportamento delle interazioni tra i componenti del sistema. Considerata la natura distribuita dell'architettura, tali test risultano fondamentali per il raggiungimento di un solido risultato.

Tabella 14: Test di integrazione

Codice	Descrizione	Moduli	Stato
TI-001	Verifica che il sistema scambi correttamente i dati tra frontend e backend tramite API REST.	UI (SPA) ↔ Laravel 12	S
TI-002	Verifica che il sistema invii il <u>prompt^G</u> e riceva la risposta generata dal servizio <u>AI^G</u> .	Backend ↔ Amazon Bedrock	S
TI-003	Verifica che il sistema persista e recuperi correttamente i dati applicativi dal database.	Backend ↔ PostgreSQL Cloud	S
TI-004	Verifica che il sistema esegua la pipeline <u>OCR^G</u> e la classificazione dei documenti tramite <u>AI Analyst^G</u> .	Backend ↔ Amazon Textract / Bedrock	S
TI-005	Verifica che il sistema gestisca correttamente l'upload, lo storage e l'accesso ai file.	Backend ↔ AWS S3 Object Storage	S
TI-006	Verifica che il sistema esegua correttamente i job in modalità asincrona tramite le code.	Backend ↔ Amazon SQS / Redis	S

4.4 Test di regressione

I test di regressione^G vengono eseguiti al termine di ogni sprint^G, dopo l'integrazione di nuove funzionalità o la correzione di difetti, con lo scopo di accertare che il comportamento già verificato non sia stato compromesso. Consistono nella riesecuzione automatica dell'intera suite di test unitari e di integrazione preesistente. Un aumento dei fallimenti costituisce un indicatore di instabilità che richiede analisi e risoluzione prima del rilascio.

4.5 Test di sistema

I test di sistema^G verificano il corretto comportamento complessivo dell'applicazione in un ambiente il più possibile simile a quello di utilizzo reale. La tabella seguente raccoglie in modo unitario tutti i test di sistema^G, raggruppati per tipologia di requisito: funzionali, di qualità e di vincolo.

Tabella 15: Test di sistema

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
Requisiti funzionali			
TS-F-001	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di compilare il <u>prompt</u> ^G testuale descrittivo del contenuto da generare.	RF1-OB	S
TS-F-002	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di selezionare il <u>tono comunicativo</u> ^G della <u>bozza</u> ^G da generare.	RF2-OB	S
TS-F-003	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di selezionare lo <u>stile editoriale</u> ^G della <u>bozza</u> ^G da generare.	RF3-OB	S
TS-F-004	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di selezionare la lunghezza desiderata per la <u>bozza</u> ^G da generare.	RF4-OP	S
TS-F-005	Verifica che il sistema avvii la generazione del contenuto tramite AI a partire dal prompt e dai parametri configurati.	RF5-OB	S
TS-F-006	Verifica che il sistema visualizzi un'anteprima della bozza generata.	RF6-OB	I
TS-F-007	Verifica che il sistema visualizzi il titolo della bozza generata nell'anteprima.	RF7-OB	I
TS-F-008	Verifica che il sistema visualizzi il testo della bozza generata nell'anteprima.	RF8-OB	I
TS-F-009	Verifica che il sistema visualizzi l'immagine di copertina della bozza generata nell'anteprima.	RF9-OB	I
TS-F-010	Verifica che il sistema permetta al Redattore di modificare manualmente il titolo della bozza.	RF10-OB	S
TS-F-011	Verifica che il sistema permetta al Redattore di modificare manualmente il testo della bozza.	RF11-OB	S
TS-F-012	Verifica che il sistema permetta al Redattore di sostituire l'immagine di copertina con un file locale.	RF12-OB	S
TS-F-013	Verifica che il sistema permetta al Redattore di eliminare l'immagine di copertina della bozza.	RF13-OB	S
TS-F-014	Verifica che il sistema permetta al Redattore di richiedere la rigenerazione della bozza mantenendo i parametri.	RF14-OB	S
TS-F-015	Verifica che il sistema permetta al Redattore di eliminare la bozza generata corrente.	RF15-OB	S
TS-F-016	Verifica che il sistema permetta al Redattore di annullare le modifiche manuali apportate alla bozza.	RF16-OP	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-017	Verifica che il sistema permetta il salvataggio della bozza nello storico.	RF17-OB	S
TS-F-018	Verifica che il sistema permetta al Redattore di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione.	RF18-OP	I
TS-F-019	Verifica che il sistema permetta la pubblicazione del documento e l'esportazione in PDF.	RF19-OB	S
TS-F-020	Verifica che il sistema permetta al Redattore di inoltrare il documento finalizzato via e-mail.	RF20-OP	S
TS-F-021	Verifica che il sistema fornisca al Redattore la libreria personale con lo storico delle generazioni.	RF21-OB	I
TS-F-022	Verifica che il sistema permetta la ricerca e il filtraggio dello storico delle generazioni e dei prompt.	RF22-OB	S
TS-F-023	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico tramite ricerca per parola chiave.	RF23-OB	S
TS-F-024	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico per tono comunicativo.	RF24-OB	S
TS-F-025	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico per stile editoriale.	RF25-OB	S
TS-F-026	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico per data.	RF26-OB	S
TS-F-027	Verifica che il sistema permetta al Redattore di salvare la configurazione del prompt nella libreria.	RF27-OB	S
TS-F-028	Verifica che il sistema permetta il caricamento e il riutilizzo di una configurazione prompt archiviata.	RF28-OB	S
TS-F-029	Verifica che il sistema permetta al Redattore di contrassegnare una generazione come preferita.	RF29-OB	S
TS-F-030	Verifica che il sistema permetta al Redattore di rimuovere una generazione dai preferiti.	RF30-OB	S
TS-F-031	Verifica che il sistema permetta l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei prompt.	RF31-OP	S
TS-F-032	Verifica che il sistema permetta al Redattore di assegnare un rating numerico alla bozza.	RF32-OB	S
TS-F-033	Verifica che il sistema permetta al Redattore di aggiungere un commento testuale qualitativo.	RF33-OB	S
TS-F-034	Verifica che il sistema fornisca all'Analista dati una dashboard con le metriche dell'AI Assistant.	RF34-OB	I
TS-F-035	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard le statistiche di utilizzo del modulo AI Assistant.	RF35-OB	I
TS-F-036	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard il rating medio delle bozze generate.	RF36-OB	I

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-037	Verifica che il sistema permetta all'Analista dati di consultare i feedback testuali ricevuti.	RF37-OB	S
TS-F-038	Verifica che il sistema permetta l'applicazione di filtri dinamici nella dashboard analitica.	RF38-OB	S
TS-F-039	Verifica che il sistema permetta di filtrare i dati della dashboard per intervallo di date.	RF39-OB	S
TS-F-040	Verifica che il sistema permetta di filtrare i dati della dashboard per tono comunicativo.	RF40-OB	S
TS-F-041	Verifica che il sistema permetta di filtrare i dati della dashboard per stile editoriale.	RF41-OB	S
TS-F-042	Verifica che il sistema permetta il caricamento di un singolo documento per l'analisi AI automatica.	RF42-OB	S
TS-F-043	Verifica che il sistema permetta il caricamento di documenti con classificazione e metadati manuali.	RF43-OB	S
TS-F-044	Verifica che il sistema permetta la selezione della tipologia del documento in fase di caricamento manuale.	RF44-OB	S
TS-F-045	Verifica che il sistema permetta l'inserimento del mese di riferimento in fase di caricamento manuale.	RF45-OB	S
TS-F-046	Verifica che il sistema permetta l'inserimento dell'anno di riferimento in fase di caricamento manuale.	RF46-OB	S
TS-F-047	Verifica che il sistema permetta l'inserimento dell'azienda di riferimento in fase di caricamento manuale.	RF47-OB	S
TS-F-048	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.	RF48-OB	I
TS-F-049	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.	RF49-OB	S
TS-F-050	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.	RF50-OB	S
TS-F-051	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per stato di scaricamento.	RF51-OB	S
TS-F-052	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per livello di confidenza dell'analisi AI.	RF52-OB	S
TS-F-053	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	RF53-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-054	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di visualizzare i dettagli di un singolo documento.	RF54-OB	I
TS-F-055	Verifica che il sistema visualizzi la porzione di documento relativa al dipendente (versione splittata).	RF55-OB	I
TS-F-056	Verifica che il sistema visualizzi il documento originale completo (non splittato).	RF56-OB	I
TS-F-057	Verifica che il sistema visualizzi il nome e cognome del dipendente associato al documento.	RF57-OB	I
TS-F-058	Verifica che il sistema visualizzi l'azienda associata al documento.	RF58-OB	I
TS-F-059	Verifica che il sistema visualizzi il nome del file del documento.	RF59-OB	I
TS-F-060	Verifica che il sistema visualizzi la data del documento.	RF60-OB	I
TS-F-061	Verifica che il sistema visualizzi il numero di pagine del documento.	RF61-OB	I
TS-F-062	Verifica che il sistema visualizzi la tipologia del documento.	RF62-OB	I
TS-F-063	Verifica che il sistema visualizzi la breve descrizione del documento.	RF63-OB	I
TS-F-064	Verifica che il sistema visualizzi il livello di confidenza in percentuale del documento.	RF64-OB	I
TS-F-065	Verifica che il sistema visualizzi lo stato del documento, comprensivo di stato di revisione e stato di scaricamento.	RF65-OP	I
TS-F-066	Verifica che il sistema visualizzi l'e-mail del destinatario del documento.	RF66-OP	I
TS-F-067	Verifica che il sistema visualizzi il codice fiscale del destinatario.	RF67-OP	I
TS-F-068	Verifica che il sistema visualizzi la matricola del dipendente.	RF68-OP	I
TS-F-069	Verifica che il sistema visualizzi la data e ora di caricamento del documento.	RF69-OP	I
TS-F-070	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di modificare il nome e cognome del dipendente.	RF70-OB	S
TS-F-071	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'azienda associata al documento.	RF71-OB	S
TS-F-072	Verifica che il sistema permetta la modifica della data del documento.	RF72-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-073	Verifica che il sistema permetta la modifica della tipologia del documento.	RF73-OB	S
TS-F-074	Verifica che il sistema permetta la modifica della breve descrizione del documento.	RF74-OB	S
TS-F-075	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.	RF75-OP	S
TS-F-076	Verifica che il sistema permetta la modifica del codice fiscale del destinatario.	RF76-OP	S
TS-F-077	Verifica che il sistema permetta la modifica della matricola del dipendente.	RF77-OP	S
TS-F-078	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di annullare le modifiche apportate ai dati del singolo documento.	RF78-OB	S
TS-F-079	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di eliminare il singolo documento.	RF79-OB	S
TS-F-080	Verifica che il sistema generi automaticamente il contenuto del messaggio precompilato per il documento.	RF80-OB	S
TS-F-081	Verifica che il sistema visualizzi il destinatario del messaggio precompilato generato automaticamente.	RF81-OB	I
TS-F-082	Verifica che il sistema visualizzi l'oggetto del messaggio precompilato generato automaticamente.	RF82-OB	I
TS-F-083	Verifica che il sistema visualizzi il testo del messaggio precompilato generato automaticamente.	RF83-OB	I
TS-F-084	Verifica che il sistema permetta la conferma e lo scaricamento del messaggio precompilato.	RF84-OB	S
TS-F-085	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di modificare il destinatario del messaggio precompilato.	RF85-OB	S
TS-F-086	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'oggetto del messaggio precompilato.	RF86-OB	S
TS-F-087	Verifica che il sistema permetta la modifica del testo del messaggio precompilato.	RF87-OB	S
TS-F-088	Verifica che il sistema fornisca all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche del modulo AI Co-Pilot.	RF88-OB	I
TS-F-089	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard il numero totale di documenti analizzati.	RF89-OB	I
TS-F-090	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard la percentuale di classificazioni corrette.	RF90-OB	I

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-091	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard i documenti sotto soglia di confidenza.	RF91-OB	I
TS-F-092	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.	RF92-OB	I
TS-F-093	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard il tempo medio di analisi dei documenti.	RF93-OB	I
TS-F-094	Verifica che il sistema notifichi il Redattore in caso di formato file non valido (copertina).	RF94-OB	S
TS-F-095	Verifica che il sistema notifichi l'utente in caso di indirizzo e-mail non valido durante l'inoltro.	RF95-OB	S
TS-F-096	Verifica che il sistema notifichi il Redattore quando la ricerca nello storico non produce risultati.	RF96-OB	S
TS-F-097	Verifica che il sistema notifichi il Redattore quando il commento testuale supera il limite di caratteri.	RF97-OB	S
TS-F-098	Verifica che il sistema notifichi l'Analista dati quando i dati analitici non sono disponibili.	RF98-OB	S
TS-F-099	Verifica che il sistema rilevi i formati file non supportati durante l'upload.	RF99-OB	S
TS-F-100	Verifica che il sistema notifichi l'utente quando nessun documento corrisponde ai criteri dello storico.	RF100-OB	S
TS-F-101	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui il nome e cognome del dipendente non siano disponibili (indicatore).	RF101-OB	S
TS-F-102	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui l'azienda non sia disponibile (indicatore).	RF102-OB	S
TS-F-103	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui la data del documento non sia disponibile (indicatore).	RF103-OB	S
TS-F-104	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui la tipologia del documento non sia disponibile (indicatore).	RF104-OB	S
TS-F-105	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui la breve descrizione non sia disponibile (indicatore).	RF105-OB	S
TS-F-106	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui il livello di confidenza non sia disponibile (indicatore).	RF106-OB	S
TS-F-107	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui l'e-mail del destinatario non sia disponibile (indicatore).	RF107-OP	S
TS-F-108	Verifica che il sistema notifichi il Consulente del lavoro in caso di codice fiscale non valido durante la modifica.	RF108-OP	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-109	Verifica che il sistema notifichi il Redattore quando il testo del prompt è mancante o insufficiente.	RF109-OB	S
Requisiti di qualità			
TS-Q-001	Verifica che l'Analisi dei Requisiti ^G sia completa di casi d'uso modellati tramite UML.	RQ1-OB	S
TS-Q-002	Verifica che le pratiche di sviluppo siano conformi alle Norme di Progetto ^G adottate dal gruppo.	RQ2-OB	S
TS-Q-003	Verifica che il prodotto superi tutti i test automatizzati con una copertura del codice (statement coverage) non inferiore all'80%.	RQ3-OB	S
TS-Q-004	Verifica che la documentazione del codice sorgente rispetti le convenzioni definite nelle Norme di Progetto ^G .	RQ4-OB	S
TS-Q-005	Verifica che il sorgente sia gestito tramite un sistema di versionamento con istruzioni di setup incluse nel repository ^G .	RQ5-OB	S
TS-Q-006	Verifica che il manuale utente del prodotto sia prodotto e aggiornato.	RQ6-OB	S
TS-Q-007	Verifica tramite sessione di user testing che gli utenti siano in grado di apprendere le funzionalità principali del sistema in meno di 30 minuti.	MPD11	S
TS-Q-008	Verifica che il codice sorgente sia versionato tramite Git ^G su un repository ^G condiviso.	RQ7-OB	S
TS-Q-009	Verifica che il codice sorgente rispetti le regole di formattazione definite da Laravel ^G Pint.	RQ8-OB	S
TS-Q-010	Verifica che la suite di test automatizzati sia scritta con il framework Pest ^G .	RQ9-OB	S
Requisiti di vincolo			
TS-V-001	Verifica che il backend sia sviluppato con il framework Laravel ^G 12 su PHP 8.4.	RVC1-OB	S
TS-V-002	Verifica che la persistenza relazionale del sistema si basi su PostgreSQL ^G erogato come servizio gestito in cloud.	RVC2-OB	S
TS-V-003	Verifica che la cache applicativa e l'archiviazione delle sessioni si basino su Redis ^G erogato in cloud.	RVC3-OB	S
TS-V-004	Verifica che il frontend sia realizzato come Single Page Application in Angular ^G con TypeScript, con build gestita tramite Angular ^G CLI.	RVC4-OB	S
TS-V-005	Verifica che l'esecuzione del sistema avvenga su infrastruttura cloud distribuita con orchestrazione di container.	RVC5-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-V-006	Verifica che l'accesso al sistema avvenga attraverso un ingress/gateway gestito con terminazione TLS.	RVC6-OB	S
TS-V-007	Verifica che lo storage dei file caricati si basi su un object storage gestito in cloud compatibile con le API Amazon S3.	RVC7-OB	S
TS-V-008	Verifica che le funzionalità <u>AI</u> ^G si basino su <u>Amazon Bedrock</u> ^G e <u>Amazon Textract</u> erogati in cloud.	RVC8-OB	S
TS-V-009	Verifica che il sistema superi i controlli di accessibilità eseguiti tramite pally e axe sulle interfacce principali.	RVC9-OB	S
TS-V-010	Verifica che il sistema sia fruibile sui principali browser moderni evergreen nelle versioni supportate: Google Chrome (min. 147), Microsoft Edge (min. 147), Mozilla Firefox (min. 149) e Safari (min. 26.4).	RVC10-OB	S
TS-V-011	Verifica che lo stack applicativo di esecuzione comprenda backend <u>Laravel</u> ^G 12 su PHP 8.4, frontend SPA <u>Angular</u> ^G 21/TypeScript, <u>PostgreSQL</u> ^G gestito, <u>Redis</u> ^G gestito, coda di messaggi compatibile con le API SQS e object storage compatibile con le API S3.	RVC11-OB	S
TS-V-012	Verifica che l'ambiente di esecuzione scali orizzontalmente in HTTPS attraverso l'ingress/gateway gestito.	RVC12-OB	S
TS-V-013	Verifica che l'utilizzo delle funzionalità <u>AI</u> ^G richieda credenziali valide del provider cloud e connettività outbound.	RVC13-OB	S
TS-V-014	Verifica che l'elaborazione asincrona dei job si appoggi a una coda di messaggi gestita in cloud compatibile con Amazon SQS.	RVC14-OB	S
TS-V-015	Verifica che la gestione di segreti e parametri avvenga tramite un servizio gestito cloud dedicato.	RVC15-OB	S
TS-V-016	Verifica che l'osservabilità del sistema si basi su strumentazione OpenTelemetry esportata verso un backend dedicato.	RVC16-OB	S
TS-V-017	Verifica che l'autenticazione degli utenti avvenga tramite un identity provider con token JWT.	RVC17-OB	S
TS-V-018	Verifica che il provisioning dell'infrastruttura cloud sia gestito tramite Infrastructure-as-Code.	RVC18-OB	S
TS-V-019	Verifica che l'invio di email e notifiche avvenga tramite un servizio cloud gestito dedicato (SES/SNS).	RVC19-OP	S

4.6 Test di accettazione

I test di accettazione^G verificano che il sistema soddisfi i requisiti utente relativi al capitolato^G d'appalto. Ogni test è associato al caso d'uso^G di riferimento.

Tabella 16: Test di accettazione

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-001	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di configurare completamente i parametri del <u>prompt</u> ^G (tono, stile, lunghezza) e avviare la generazione <u>AI</u> ^G con successo.	UC-1	S
TA-002	Verifica che il sistema notifichi il <u>Redattore</u> ^G qualora tenti di avviare la generazione con il campo <u>prompt</u> ^G assente o insufficiente.	UC-1	S
TA-003	Verifica che il sistema visualizzi correttamente l'anteprima della <u>bozza</u> ^G generata con titolo, testo e immagine di copertina.	UC-2	I
TA-004	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di modificare manualmente il titolo e il testo della <u>bozza</u> ^G e di visualizzare il contenuto aggiornato.	UC-2	S
TA-005	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di rigenerare la <u>bozza</u> ^G mantenendo la configurazione del <u>prompt</u> ^G corrente.	UC-2	S
TA-006	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di eliminare la <u>bozza</u> ^G generata corrente.	UC-2	S
TA-007	Verifica che il sistema permetta il salvataggio del documento finalizzato come <u>bozza</u> ^G nello storico.	UC-3	S
TA-008	Verifica che il sistema permetta l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF, con anteprima pre-esportazione.	UC-3	S
TA-009	Verifica che il sistema permetta l'inoltro del documento finalizzato via e-mail e notifichi il <u>Redattore</u> ^G in caso di indirizzo non valido.	UC-3	S
TA-010	Verifica che il sistema visualizzi la libreria personale con lo storico delle generazioni e i <u>prompt</u> ^G salvati, con possibilità di eliminazione.	UC-4	I
TA-011	Verifica che il sistema permetta la ricerca, il filtraggio e il riutilizzo di una configurazione <u>prompt</u> ^G dalla libreria personale.	UC-4	S
TA-012	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di inserire e inviare una valutazione qualitativa con <u>rating</u> ^G numerico sulla <u>bozza</u> ^G generata.	UC-5	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-013	Verifica che il sistema notifichi il <u>Redattore</u> ^G qualora tenti di inviare la valutazione senza aver assegnato un <u>rating</u> ^G .	UC-5	S
TA-014	Verifica che il sistema esponga all' <u>Analista dati</u> ^G la <u>dashboard</u> ^G <u>AI</u> ^G Assistant con panoramica dell'attività complessiva e statistiche di utilizzo.	UC-6	I
TA-015	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G <u>AI</u> ^G Assistant il <u>rating</u> ^G medio delle bozze e permetta la consultazione dei feedback testuali.	UC-6	I
TA-016	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di caricare un singolo documento nel <u>repository</u> ^G con classificazione automatica tramite <u>AI Analyst</u> ^G .	UC-32	S
TA-017	Obsoleto / Ritirato.	/	/
TA-018	Verifica che il sistema rilevi un file in formato non supportato durante l'upload e notifichi il <u>Consulente del lavoro</u> ^G .	UC-62	S
TA-019	Verifica che il sistema visualizzi al <u>Consulente del lavoro</u> ^G lo storico dei documenti analizzati e notifichi in caso di assenza di risultati.	UC-34, UC-63	I
TA-020	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite la combinazione di più criteri contemporaneamente.	UC-35	S
TA-021	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite la barra di ricerca testuale.	UC-36	S
TA-022	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per stato di scaricamento.	UC-37	S
TA-023	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per livello di confidenza dell'analisi <u>AI</u> ^G .	UC-38	S
TA-024	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	UC-39	S
TA-025	Verifica che il sistema visualizzi i dettagli completi di un documento dallo storico, inclusi i <u>metadati</u> ^G associati e la versione splittata del documento originale.	UC-40	I
TA-026	Verifica che il sistema permetta la modifica dei <u>metadati</u> ^G principali di un documento (nome destinatario, azienda, data, tipologia, descrizione) e il relativo salvataggio.	UC-41, UC-42, UC-43, UC-44, UC-45	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-027	Verifica che il sistema notifichi il <u>Consulente del lavoro</u> ^G in caso di e-mail o codice fiscale in formato non valido durante la modifica dei <u>metadati</u> ^G .	UC-70, UC-71	S
TA-028	Verifica che il sistema generi automaticamente il messaggio precompilato per il documento selezionato e ne visualizzi destinatario, oggetto e testo.	UC-51	S
TA-029	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di modificare il destinatario, l'oggetto e il testo del messaggio precompilato e di confermarne l'esportazione/scaricamento.	UC-52, UC-53, UC-54, UC-55	S
TA-030	Verifica che il sistema esponga all' <u>Analista dati</u> ^G la <u>dashboard</u> ^G Co-Pilot con metriche di monitoraggio dell'analisi documentale (totale documenti, classificazioni corrette, documenti sotto soglia, destinatari riconosciuti, tempo medio di analisi).	UC-56	I

4.7 Tracciamento

La tabella seguente riporta la corrispondenza tra i test di sistema^G e i requisiti coperti, e tra i test di accettazione^G e i casi d'uso di riferimento.

Tabella 17: Tracciamento test di sistema – requisiti

Codice test	Requisito	Codice test	Requisito
Funzionali			
TS-F-001	RF1-OB	TS-F-002	RF2-OB
TS-F-003	RF3-OB	TS-F-004	RF4-OP
TS-F-005	RF5-OB	TS-F-006	RF6-OB
TS-F-007	RF7-OB	TS-F-008	RF8-OB
TS-F-009	RF9-OB	TS-F-010	RF10-OB
TS-F-011	RF11-OB	TS-F-012	RF12-OB
TS-F-013	RF13-OB	TS-F-014	RF14-OB
TS-F-015	RF15-OP	TS-F-016	RF16-OB
TS-F-017	RF17-OP	TS-F-018	RF18-OB
TS-F-019	RF19-OB	TS-F-020	RF20-OB
TS-F-021	RF21-OB	TS-F-022	RF22-OB
TS-F-023	RF23-OB	TS-F-024	RF24-OB
TS-F-025	RF25-OB	TS-F-026	RF26-OB
TS-F-027	RF27-OB	TS-F-028	RF28-OB
TS-F-029	RF29-OB	TS-F-030	RF30-OP
TS-F-031	RF31-OB	TS-F-032	RF32-OB
TS-F-033	RF33-OB	TS-F-034	RF34-OB
TS-F-035	RF35-OB	TS-F-036	RF36-OB
TS-F-037	RF37-OB	TS-F-038	RF38-OB
TS-F-039	RF39-OB	TS-F-040	RF40-OB

Codice test	Requisito	Codice test	Requisito
TS-F-041	RF41-OB	TS-F-042	RF42-OB
TS-F-043	RF43-OB	TS-F-044	RF44-OB
TS-F-045	RF45-OB	TS-F-046	RF46-OB
TS-F-047	RF47-OB	TS-F-048	RF48-OB
TS-F-049	RF49-OB	TS-F-050	RF50-OB
TS-F-051	RF51-OB	TS-F-052	RF52-OB
TS-F-053	RF53-OB	TS-F-054	RF54-OB
TS-F-055	RF56-OB	TS-F-056	RF57-OB
TS-F-057	RF58-OB	TS-F-058	RF59-OB
TS-F-059	RF60-OB	TS-F-060	RF61-OB
TS-F-061	RF62-OB	TS-F-062	RF63-OB
TS-F-063	RF64-OB	TS-F-064	RF65-OB
TS-F-065	RF66-OP	TS-F-066	RF67-OP
TS-F-067	RF68-OP	TS-F-068	RF69-OP
TS-F-069	RF70-OB	TS-F-070	RF71-OB
TS-F-071	RF72-OB	TS-F-072	RF73-OB
TS-F-073	RF74-OB	TS-F-074	RF75-OP
TS-F-075	RF76-OP	TS-F-076	RF77-OP
TS-F-077	RF80-OB	TS-F-078	RF81-OB
TS-F-079	RF82-OB	TS-F-080	RF83-OB
TS-F-081	RF84-OB	TS-F-082	RF85-OB
TS-F-083	RF86-OB	TS-F-084	RF87-OB
TS-F-085	RF88-OB	TS-F-086	RF89-OB
TS-F-087	RF90-OB	TS-F-088	RF91-OB
TS-F-089	RF92-OB	TS-F-090	RF93-OB
TS-F-091	RF94-OB	TS-F-092	RF95-OB
TS-F-093	RF96-OB	TS-F-094	RF97-OB
TS-F-095	RF98-OB	TS-F-096	/
TS-F-097	RF99-OB	TS-F-098	RF100-OB
TS-F-099	RF101-OB	TS-F-100	RF102-OB
TS-F-101	RF103-OB	TS-F-102	RF104-OB
TS-F-103	RF105-OB	TS-F-104	RF106-OB
TS-F-105	RF107-OP	TS-F-106	RF108-OP
TS-F-107	RF109-OB	TS-F-108	RF78-OB
TS-F-109	RF79-OB		
Qualità			
TS-Q-001	RQ1-OB	TS-Q-002	RQ2-OB
TS-Q-003	RQ3-OB	TS-Q-004	RQ4-OB
TS-Q-005	RQ5-OB	TS-Q-006	RQ6-OB
TS-Q-007	MPD11	TS-Q-008	RQ7-OB
TS-Q-009	RQ8-OB	TS-Q-010	RQ9-OB
Vincolo			
TS-V-001	RVC1-OB	TS-V-002	RVC2-OB
TS-V-003	RVC3-OB	TS-V-004	RVC4-OB
TS-V-005	RVC5-OB	TS-V-006	RVC6-OB
TS-V-007	RVC7-OB	TS-V-008	RVC8-OB
TS-V-009	RVC9-OB	TS-V-010	RVC10-OB
TS-V-011	RVC11-OB	TS-V-012	RVC12-OB

Codice test	Requisito	Codice test	Requisito
TS-V-013	RVC13-OB	TS-V-014	RVC14-OB
TS-V-015	RVC15-OB	TS-V-016	RVC16-OB
TS-V-017	RVC17-OB	TS-V-018	RVC18-OB
TS-V-019	RVC19-OP		

Tabella 18: Tracciamento test di accettazione – casi d’uso

Codice test	Caso d’uso ^G	Codice test	Caso d’uso ^G
TA-001	UC-1	TA-002	UC-1
TA-003	UC-2	TA-004	UC-2
TA-005	UC-2	TA-006	UC-2
TA-007	UC-3	TA-008	UC-3
TA-009	UC-3	TA-010	UC-4
TA-011	UC-4	TA-012	UC-5
TA-013	UC-5	TA-014	UC-6
TA-015	UC-6	TA-016	UC-32
TA-017	/	TA-018	UC-62
TA-019	UC-34,UC-63	TA-020	UC-35
TA-021	UC-36	TA-022	UC-37
TA-023	UC-38	TA-024	UC-39
TA-025	UC-40	TA-026	UC-41,UC-42,UC-43,UC-44,UC-45
TA-027	UC-70,UC-71	TA-028	UC-51
TA-029	UC-52,UC-53,UC-54,UC-55	TA-030	UC-56

5 Cruscotto di qualità

Il cruscotto di qualità raccoglie i dati misurati nelle diverse iterazioni del progetto, mettendoli in relazione con le soglie accettabili e ottimali definite nella sezione *Qualità di processo*. L’obiettivo è fornire una visione sintetica e aggiornata dello stato qualitativo del prodotto e dei processi, permettendo di identificare tempestivamente eventuali aree di miglioramento.

Le misurazioni si riferiscono ai dieci sprint^G rendicontati, di cui i primi sette appartengono alla fase RTB^G e gli ultimi tre alla fase PB^G:

- Sprint^G 1 (S1): 30/03/2026 – 12/04/2026
- Sprint^G 2 (S2): 13/04/2026 – 26/04/2026
- Sprint^G 3 (S3): 27/04/2026 – 10/05/2026
- Sprint^G 4 (S4): 11/05/2026 – 24/05/2026
- Sprint^G 5 (S5): 25/05/2026 – 07/06/2026

- **Sprint^G 6 (S6):** 08/06/2026 – 21/06/2026
- **Sprint^G 7 (S7):** 22/06/2026 – 05/07/2026
- **Sprint^G 8 (S8):** 06/07/2026 – 19/07/2026 (*primo sprint^G della fase PB^G*)
- **Sprint^G 9 (S9):** 20/07/2026 – 02/08/2026
- **Sprint^G 10 (S10):** 03/08/2026 – 16/08/2026

Il Budget At Completion (BAC) dell'intero progetto è pari a 12.575,00 € e non è stato rivisto durante il passaggio alla fase PB^G.

Per ciascuna metrica, l'analisi descrittiva è suddivisa in due sottoparagrafi: **Requirements and Technology Baseline (RTB)**, che riporta le considerazioni già formulate al termine dello Sprint 7, e **Product Baseline (PB)**, che descrive l'andamento rilevato negli Sprint 8, 9 e 10. I grafici e le tabelle di dettaglio restano invece unificati sull'intero arco progettuale, per mantenere la continuità visiva dall'inizio della RTB fino allo stato attuale della PB.

5.1 Processi primari — Fornitura

5.1.1 MPC-EV e MPC-PV — Earned Value e Planned Value

Il Planned Value (PV) rappresenta il valore pianificato del lavoro da completare entro ciascuno sprint^G, estratto dai preventivi del Piano di Progetto^G. L'Earned Value (EV) rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato. Nella fase RTB^G si assume che gli obiettivi di ogni sprint^G siano stati completamente raggiunti (come risulta dalle retrospettive nel Piano di Progetto^G), pertanto $EV = PV$ per tutti gli sprint^G.

<u>Sprint^G</u>	PV (€)	EV (€)	PV cum. (€)	EV cum. (€)
S1	670,00	670,00	670,00	670,00
S2	565,00	565,00	1.235,00	1.235,00
S3	750,00	750,00	1.985,00	1.985,00
S4	850,00	850,00	2.835,00	2.835,00
S5	530,00	530,00	3.365,00	3.365,00
S6	980,00	980,00	4.345,00	4.345,00
S7	755,00	755,00	5.100,00	5.100,00
S8	895,00	895,00	5.995,00	5.995,00
S9	1.150,00	1.150,00	7.145,00	7.145,00
S10	1.200,00	1.200,00	8.345,00	8.345,00

Tabella 19: Andamento MPC-EV e MPC-PV per sprint

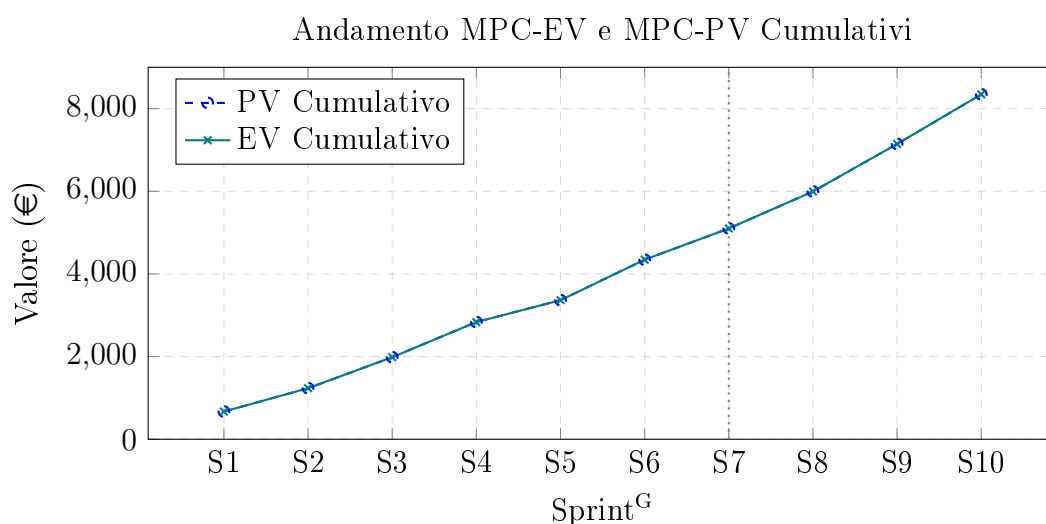


Figura 1: Grafico dell'andamento cumulativo di Planned Value ed Earned Value per sprint.

Requirements and Technology Baseline (RTB) Entrambi i valori sono ≥ 0 per tutti gli sprint^G (*soglia accettabile* raggiunta). Il PV cumulativo è $\leq BAC = 12.575,00$ e (*soglia ottimale per MPC-PV* raggiunta); l'EV cumulativo è $\leq EAC$ (*soglia ottimale per MPC-EV* raggiunta).

Product Baseline (PB) Anche negli Sprint 8, 9 e 10 le retrospettive del Piano di Progetto^G riportano il completamento sostanziale degli obiettivi pianificati (Sprint 9 e Sprint 10 interamente “Completata”; Sprint 8 con la sola stesura delle Specifiche Tecniche ancora “In corso”, di peso marginale sul valore complessivo dello sprint^G), pertanto si mantiene l'ipotesi $EV = PV$ già adottata in RTB. Il PV cumulativo prosegue la crescita raggiungendo 8.345,00 € a S10, restando $\leq BAC$ (*soglia ottimale* raggiunta); l'EV cumulativo segue lo stesso andamento, confermando che il valore del lavoro completato resta sempre ≥ 0 (*soglia accettabile* raggiunta).

5.1.2 MPC-AC — Actual Cost

L'Actual Cost (AC) rappresenta il costo effettivo sostenuto per il lavoro completato in ciascuno sprint^G, ricavato dai consuntivi del Piano di Progetto^G.

Sprint ^G	AC (€)	AC cumulativo (€)
S1	705,00	705,00
S2	625,00	1.330,00
S3	830,00	2.160,00
S4	975,00	3.135,00
S5	515,00	3.650,00
S6	955,00	4.605,00
S7	755,00	5.360,00
S8	880,00	6.240,00
S9	1.105,00	7.345,00
S10	1.045,00	8.390,00

Tabella 20: Andamento MPC-AC per sprint

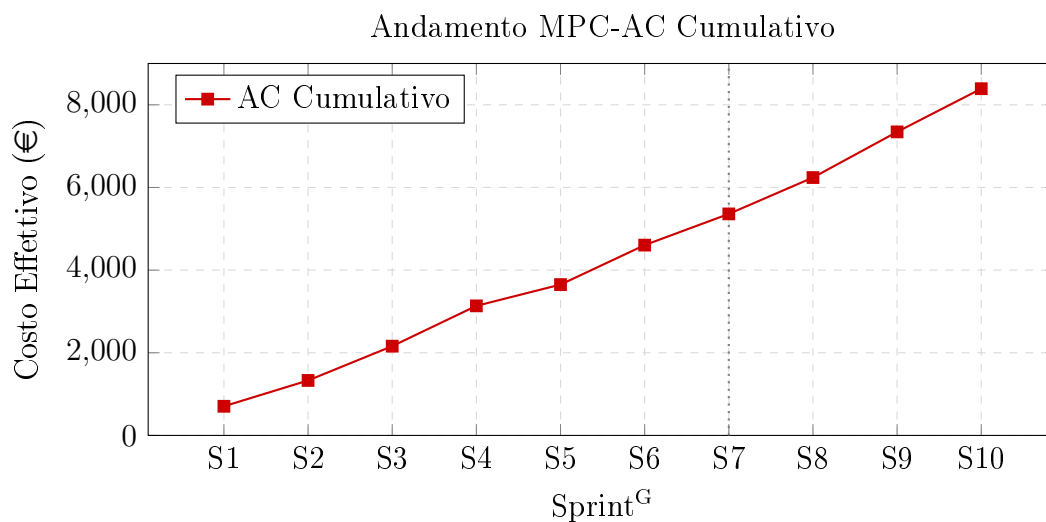


Figura 2: Grafico dell'andamento dei costi effettivi cumulati.

Requirements and Technology Baseline (RTB) I costi effettivi sono positivi in tutti gli sprint^G (*soglia accettabile* raggiunta). Rispetto al PV si osserva un lieve sfioramento iniziale, ridotto sensibilmente negli Sprint 5, 6 e 7 grazie alle attività mirate di controllo sui costi operativi.

Product Baseline (PB) L'AC resta positivo anche negli Sprint 8, 9 e 10 (*soglia accettabile* raggiunta). Lo scostamento rispetto al PV si mantiene contenuto: 895,00 € preventivati contro 880,00 € consuntivati a S8 (-15,00 €), 1.150,00 € contro 1.105,00 € a S9 (-45,00 €) e 1.200,00 € contro 1.045,00 € a S10 (-155,00 €), confermando che il controllo dei costi introdotto nella seconda metà della RTB si è consolidato anche nella fase PB^G.

5.1.3 MPC-CPI e MPC-SPI — Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Il Cost Performance Index misura l'efficienza dei costi:

$$CPI = \frac{EV_{cum}}{AC_{cum}}$$

Lo Schedule Performance Index misura l'efficienza del tempo:

$$SPI = \frac{EV_{cum}}{PV_{cum}}$$

<u>Sprint^G</u>	CPI	SPI
S1	0,950	1,000
S2	0,929	1,000
S3	0,919	1,000
S4	0,904	1,000
S5	0,922	1,000
S6	0,944	1,000
S7	0,951	1,000
S8	0,961	1,000
S9	0,973	1,000
S10	0,995	1,000

Tabella 21: Andamento MPC-CPI e MPC-SPI per sprint

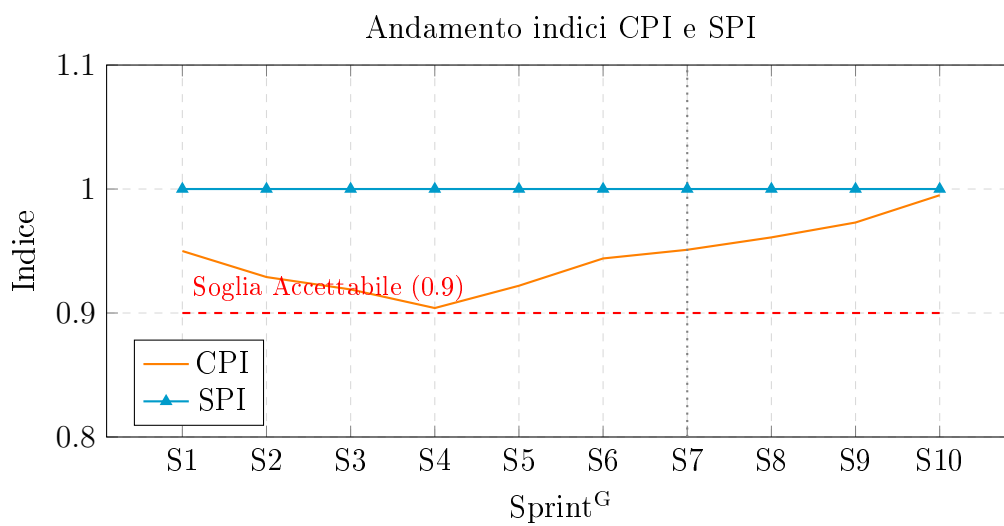


Figura 3: Confronto tra Cost Performance Index e Schedule Performance Index.

Requirements and Technology Baseline (RTB) Il CPI, dopo aver toccato il punto minimo a S4 (0,904), risale progressivamente fino a raggiungere il valore di 0,951 a S7 (*soglia accettabile* ampiamente superata). L'SPI stabile a 1,000 in tutti gli sprint^G conferma il perfetto rispetto delle scadenze e dell'avanzamento dei lavori previsti (*soglia ottimale* raggiunta).

Product Baseline (PB) Il CPI prosegue la risalita avviata a fine RTB, raggiungendo 0,961 a S8, 0,973 a S9 e 0,995 a S10: il valore più alto misurato dall'avvio del progetto, ormai a ridosso della *soglia ottimale* di 1 (*soglia accettabile* $\geq 0,9$ ampiamente superata). Il miglioramento conferma l'efficacia del controllo dei costi introdotto tra le due fasi. L'SPI resta stabile a 1,000 anche in PB (*soglia ottimale* raggiunta), poiché anche in questi tre sprint^G il lavoro pianificato risulta sostanzialmente completato.

5.1.4 MPC-EAC e MPC-ETC — Estimated At Completion e Estimate To Complete

L'Estimated At Completion stima il costo totale del progetto proiettando la performance corrente:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

L'Estimate To Complete rappresenta la stima dei costi rimanenti al completamento:

$$ETC = EAC - AC_{cum}$$

<u>Sprint^G</u>	EAC (€)	ETC (€)
S1	13.231,00	12.526,00
S2	13.544,00	12.214,00
S3	13.683,00	11.523,00
S4	13.906,00	10.771,00
S5	13.640,00	9.990,00
S6	13.328,00	8.723,00
S7	13.216,00	7.856,00
S8	13.089,00	6.849,00
S9	12.927,00	5.582,00
S10	12.643,00	4.253,00

Tabella 22: Andamento MPC-EAC e MPC-ETC per sprint

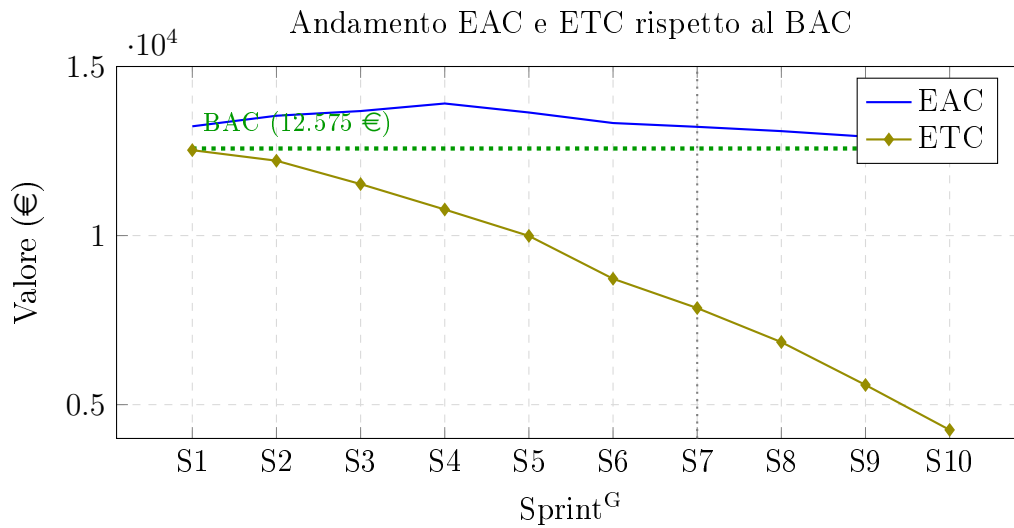


Figura 4: Proiezione dei costi finali (EAC) e costi a finire (ETC) rispetto al budget.

Requirements and Technology Baseline (RTB) L'EAC proiettato si abbassa ulteriormente a S7 attestandosi a 13.216,00 €, riducendo lo scostamento complessivo dal BAC a +5,1%. L'ETC decresce regolarmente e rimane ampiamente positivo (*soglia accettabile* raggiunta). La decrescita dell'EAC evidenzia l'efficacia delle azioni correttive sui processi organizzativi.

Product Baseline (PB) L'EAC continua a scendere anche in PB, raggiungendo 13.089,00 € a S8 (+4,1% dal BAC), 12.927,00 € a S9 (+2,8% dal BAC) e 12.643,00 € a S10 (+0,5% dal BAC): a partire da S9 lo scostamento rientra stabilmente entro la *soglia ottimale* $\pm 5\%$ definita per MPC-EAC, e a S10 si riduce ulteriormente fino quasi ad azzerarsi, confermando l'efficacia dell'azione di miglioramento sulla pianificazione^G avviata alla chiusura della RTB (si veda la Sezione 6). L'ETC prosegue la propria decrescita regolare, scendendo a 4.253,00 € a S10, e resta ≥ 0 (*soglia accettabile* raggiunta).

5.1.5 MPC-TEAC — Time Estimate At Completion

Il Time Estimate At Completion stima la durata totale della fase in corso a partire dalla performance di avanzamento temporale. Poiché SPI = 1,000 per tutte le scadenze, il team rispetta fedelmente la pianificazione temporale aggiornata. La durata totale stimata per la conclusione della fase RTB si assesta a 14 settimane in concomitanza con la sottomissione formale avvenuta al termine dello Sprint 7. Con l'avvio della fase PB^G il conteggio riparte da una nuova baseline temporale: la pianificazione^G a lungo termine descritta nel Piano di Progetto^G proietta 5 sprint^G (S8-S12, dal 06/07/2026 al 10/09/2026) per una durata pianificata di 9,4 settimane.

<u>Sprint</u> ^G	SPI	TEAC (settimane)
S1	1,000	8,0
S2	1,000	8,0
S3	1,000	8,0
S4	1,000	8,0
S5	1,000	10,0
S6	1,000	12,0
S7	1,000	14,0
S8	1,000	9,4
S9	1,000	9,4
S10	1,000	9,4

Tabella 23: Andamento MPC-TEAC per sprint

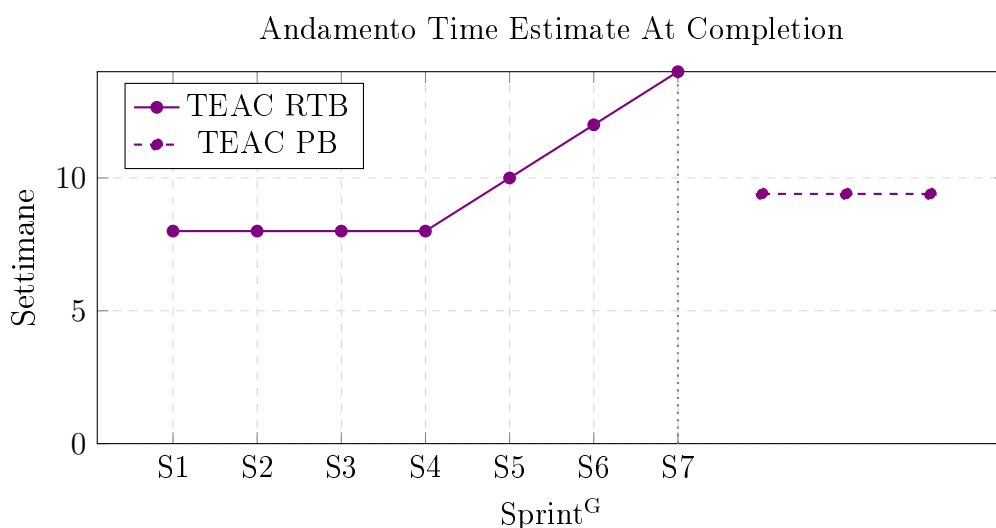


Figura 5: Stima del tempo finale di conclusione delle attività (per fase).

Requirements and Technology Baseline (RTB) La performance temporale si attesta esattamente in linea con la pianificazione di recupero post-retrospettiva (*soglia accettabile* raggiunta).

Product Baseline (PB) Con l'ingresso in PB^G il TEAC riparte da una nuova baseline temporale di fase, pari a 9,4 settimane (5 sprint^G, S8-S12). L'SPI resta pari a 1,000 anche a S8, S9 e S10, per cui la stima non necessita di correzioni: il valore rimane costante a 9,4 settimane in tutti e tre gli sprint^G (*soglia accettabile* ≥ 0 raggiunta), a conferma che la pianificazione^G a lungo termine verso la consegna finale (10/09/2026) è, ad oggi, pienamente rispettata.

5.2 Processi primari — Sviluppo

5.2.1 MPC-RSI — Requirements Stability Index

Il Requirements Stability Index valuta la stabilità dei requisiti nel tempo. La baseline consolidata a S3 (131 requisiti) è rimasta invariata durante lo Sprint 5. In seguito alla revisione e all'esito negativo, durante lo Sprint 6 il team ha svolto una profonda ristrutturazione dell'Analisi dei Requisiti (v2.0.0), portando i requisiti totali a 135 (107 funzionali, 9 di qualità e 19 di vincolo), introducendo 6 requisiti, modificandone 8 e rimuovendone 2.

Sprint ^G	Baseline	Aggiunti	Modificati	Eliminati	RSI (%)	Esito
S1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S3	131	0	0	0	100%	Ottimo
S4	131	0	4	0	96,9%	Accettabile
S5	131	0	0	0	100%	Ottimo
S6	131	6	8	2	87,8%	Accettabile
S7	135	0	0	0	100%	Ottimo
S8	135	0	0	0	100%	Ottimo
S9	135	0	0	0	100%	Ottimo
S10	135	0	0	0	100%	Ottimo

Tabella 24: Andamento MPC-RSI per sprint

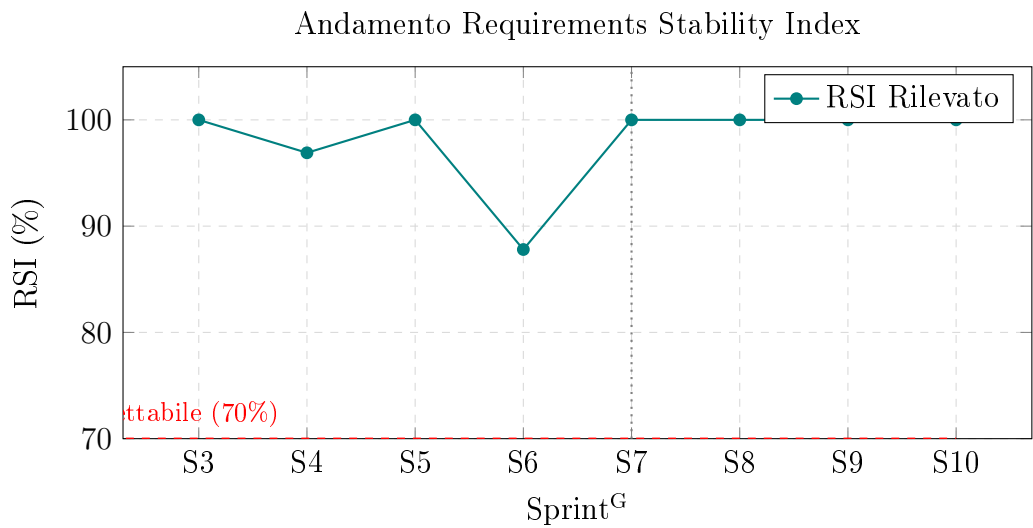


Figura 6: Grafico della stabilità dei requisiti post-consolidamento.

Requirements and Technology Baseline (RTB) L’RSI a S6 si attesta all’87,8%. Nonostante l’ampia attività di riscrittura formale e l’adeguamento della tassonomia del tracciamento, l’indice si mantiene ampiamente sopra la soglia minima accettabile del 70% (*soglia accettabile* raggiunta).

Product Baseline (PB) Negli Sprint 8, 9 e 10 la baseline dei requisiti, consolidata a 135 voci al termine della RTB, non ha subito ulteriori aggiunte, modifiche o eliminazioni: i nuovi casi d'uso^G assegnati durante la riunione interna del 29/07/2026 (UC21, UC22, UC32, UC39.12, UC39.15) rientrano infatti tra i requisiti già tracciati nell'Analisi dei Requisiti^G e ne rappresentano l'implementazione, non una variazione; anche il controllo dell'Analisi dei Requisiti^G svolto dall'Analista^G a S10 non ha rilevato scostamenti. L'RSI si mantiene quindi al 100% in tutti e tre gli sprint^G (*soglia ottimale raggiunta*), a conferma della stabilità raggiunta dal documento dopo la ristrutturazione operata a S6.

5.3 Processi di supporto — Documentazione

5.3.1 MPC-IG — Indice di Gulpease

L'Indice di Gulpease^G misura la leggibilità dei documenti in lingua italiana secondo la formula:

$$G = 89 - \frac{10 \cdot L}{P} + \frac{300 \cdot F}{P}$$

dove *L* è il numero di lettere, *P* il numero di parole e *F* il numero di frasi. Il calcolo è stato effettuato tramite estrazione del testo con detex^G e script Python.

Documento	Indice di Gulpease ^G	Soglia accettabile	Esito
Analisi dei Requisiti ^G	59,7	≥ 60	Borderline
Norme di Progetto ^G	45,9	≥ 60	Da migliorare
Piano di Progetto ^G	47,7	≥ 60	Da migliorare
Piano di Qualifica ^G	55,8	≥ 60	Da migliorare

Tabella 25: Indice di Gulpease dei documenti RTB

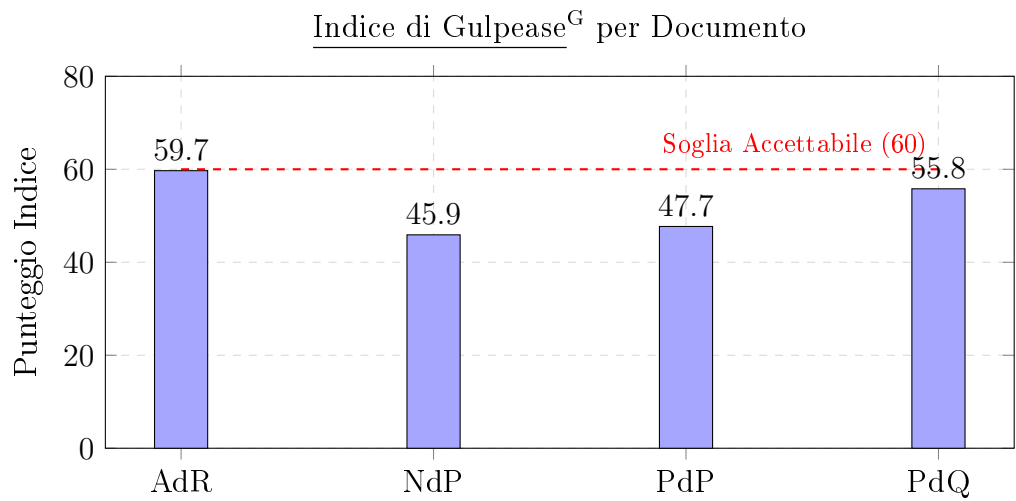


Figura 7: Livello di leggibilità dei documenti calcolato tramite Indice di Gulpease.

Requirements and Technology Baseline (RTB) I documenti tecnici mostrano punteggi compresi tra 45,9 e 59,7. Questo risultato è strutturalmente atteso: la terminologia tecnica specialistica, gli acronimi e i costrutti formali riducono l'indice di leggibilità nei documenti ingegneristici. Si raccomanda di semplificare ove possibile la struttura delle frasi nelle prossime revisioni.

Product Baseline (PB) Durante gli Sprint 8, 9 e 10 i documenti RTB sono stati oggetto di interventi mirati: a S8 la correzione dei punti con riscontro negativo dai docenti, a S9 l'aggiornamento del Piano di Progetto^G (aggiunta degli Sprint 8-9) e del presente Piano di Qualifica^G, a S10 il proseguimento dell'aggiornamento di Piano di Progetto^G e Piano di Qualifica^G (rendiconto dello Sprint 10) insieme alla revisione delle Norme di Progetto^G e delle specifiche tecniche. Tali interventi non erano orientati alla leggibilità ma alla correttezza dei contenuti e all'estensione dei dati rendicontati, per cui non si prevede una variazione significativa dell'indice. Il ricalcolo formale tramite detex^G e script Python, con la stessa metodologia già applicata in RTB, è pianificato al termine della fase PB^G, quando i documenti raggiungeranno una nuova versione stabile; resta comunque valida la raccomandazione di semplificare la struttura dei periodi più densi nelle prossime revisioni.

5.3.2 MPC-CO — Correttezza ortografica

La verifica è stata condotta tramite estrazione del testo con detex^G e analisi automatica della correttezza ortografica.

Documento	Errori ortografici	Esito
Analisi dei Requisiti ^G	0	Soddisfatta
Norme di Progetto ^G	0	Soddisfatta
Piano di Progetto ^G	0	Soddisfatta
Piano di Qualifica ^G	0	Soddisfatta

Tabella 26: Correttezza ortografica dei documenti RTB

Requirements and Technology Baseline (RTB) Tutti i documenti presentano 0 errori ortografici (*soglia ottimale* raggiunta).

Product Baseline (PB) Le revisioni effettuate negli Sprint 8, 9 e 10 sui documenti RTB (correzione dei riscontri negativi, aggiornamento di Piano di Progetto^G, Piano di Qualifica^G, Norme di Progetto^G e specifiche tecniche) hanno mantenuto la stessa prassi di verifica incrociata già adottata in RTB, con controllo da parte del Verificatore^G assegnato allo sprint^G prima della chiusura — a S10 sulle 17 ore consuntivate su 18 previste. Non sono stati segnalati errori ortografici nei contenuti aggiunti o modificati; il ricalcolo automatico tramite detex^G verrà comunque ripetuto in occasione della prossima versione stabile dei documenti, in coerenza con la cadenza già adottata per MPC-IG^G (*soglia ottimale* 0 errori, ad oggi confermata).

5.4 Processi di supporto — Verifica

5.4.1 MPC-CC e MPC-TSR — Code Coverage e Test Success Rate

Requirements and Technology Baseline (RTB) Le metriche MPC-CC (Code Coverage) e MPC-TSR (Test Success Rate) non sono ancora considerate pienamente applicabili nella fase RTB^G, poiché il codice realizzato in RTB^G ha natura dimostrativa e non coincide con una baseline stabile di prodotto. La misurazione sistematica di tali metriche è prevista a partire dalla fase PB (Product Baseline)^G, quando verrà sviluppata e consolidata la baseline di riferimento e i test automatici potranno essere utilizzati come criterio continuativo di verifica.

Product Baseline (PB) Negli Sprint 8 e 9 il gruppo ha creato la nuova repository dedicata all'MVP^G e ha riorganizzato nomi di package, file e porzioni di codice ereditate dal PoC, avviando le prime implementazioni funzionali (Macro-fase 2); a S10 lo sviluppo dell'MVP^G è proseguito (9 ore consuntivate su 9 previste) in parallelo al consolidamento della documentazione di progetto. La suite di test automatizzati con Pest^G, prevista dalle azioni di miglioramento della verifica (Sezione 6), non è ancora stata collegata a un quality gate continuativo su questi tre sprint^G: MPC-CC e MPC-TSR restano pertanto **N/A** anche per S8, S9 e S10. La prima misurazione sistematica è attesa a partire dagli sprint^G successivi, quando i componenti del MVP^G core (Macro-fase 2) raggiungeranno una copertura funzionale sufficiente a costituire una baseline stabile.

5.5 Processi di supporto — Gestione della qualità

5.5.1 MPC-QMS — Quality Metrics Satisfied

Il Quality Metrics Satisfied misura la percentuale di metriche di processo che soddisfano la soglia accettabile nel periodo di riferimento:

$$\text{QMS} = \frac{\text{Metriche soddisfatte}}{\text{Metriche misurate}} \times 100\%$$

La tabella seguente riassume l'esito di tutte le metriche misurabili nella fase RTB^G. Con l'inclusione delle metriche MPC-RSI e MPC-PRI, le metriche misurate passano a 12.

Metrica	Valore misurato	Soglia accettabile	Esito
MPC-EV	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-PV	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-AC	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-CPI	0,951 (S7)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-SPI	1,000 (tutti gli <u>sprint</u> ^G)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-EAC	+5,1% dal BAC (S7)	$\pm 5\%$ dal BAC	Da migliorare
MPC-ETC	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-TEAC	14 settimane (SPI = 1,000)	≥ 0	Soddisfatta
<u>MPC-IG</u> ^G	45,9 – 59,7	≥ 60	Da migliorare
MPC-CO	0 errori	0 errori	Soddisfatta
MPC-RSI	100% (S7)	$\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-PRI	22,2% (fino a S7)	$\leq 20\%$	Da migliorare
Metriche soddisfatte / Metriche misurate			9 / 12
MPC-QMS			75%

Tabella 27: Calcolo MPC-QMS — Periodo RTB (aggiornato fino a S7)

Requirements and Technology Baseline (RTB) L'indice MPC-QMS riflette la conformità complessiva dei processi del team. In S1, la soddisfazione è massima (100%) per i dati valutati in quel frangente. Nei successivi S2 e S3 il valore si stabilizza all'80%. Nello Sprint^G 4, 5 e 6, con l'inclusione delle metriche globali RSI e PRI del periodo RTB^G, il QMS si attesta stabilmente al 75% (essendo MPC-PRI, MPC-EAC e MPC-IG da migliorare). Il grafico seguente mostra questo andamento, confrontato con le soglie di accettabilità e ottimalità, esteso fino agli sprint^G della fase PB^G.

Andamento MPC-QMS per Sprint^G rispetto alle Soglie

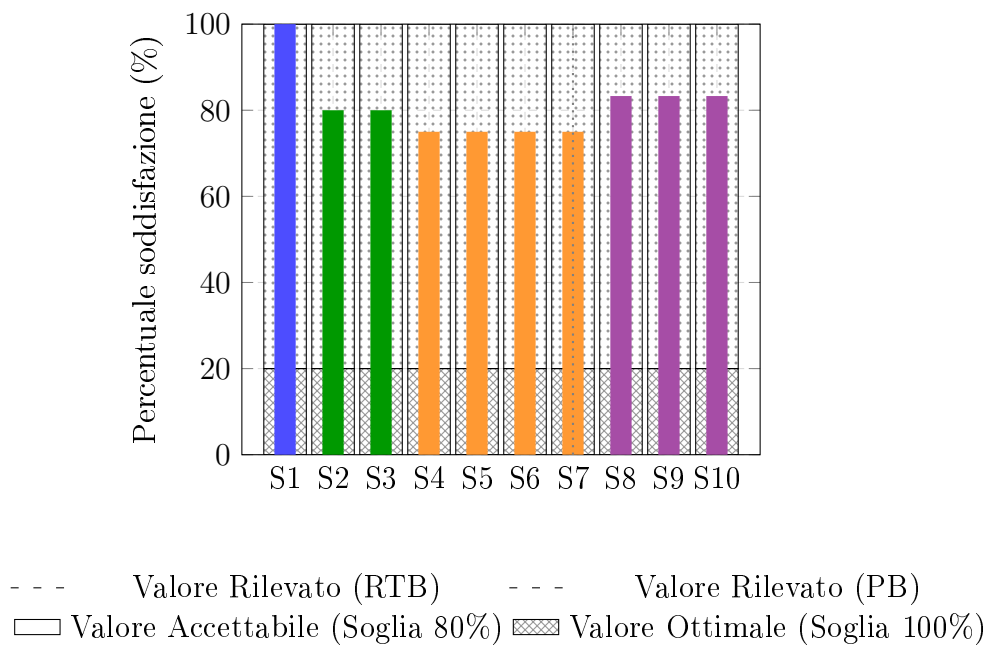


Figura 8: Grafico percentuale di metriche soddisfatte (MPC-QMS) per sprint confrontato con le soglie di riferimento.

Valutazione: Il QMS complessivo al termine della fase RTB^G è pari al 75%. Tre metriche richiedono interventi correttivi:

- **MPC-EAC:** il costo stimato a completamento richiede un controllo più rigoroso dei costi, con revisione periodica delle stime e delle allocazioni orarie.
- **MPC-PRI:** il verificarsi di imprevisti bloccanti (22,2% rispetto ai rischi emersi) suggerisce che il registro dei rischi necessita di un ampliamento e aggiornamento in vista dello sviluppo operativo PB^G.
- **MPC-IG**^G: i documenti tecnici presentano indici di leggibilità inferiori alle aspettative. Si raccomanda una revisione stilistica nelle prossime versioni, semplificando la struttura delle frasi.

Product Baseline (PB) La tabella seguente ricalcola MPC-QMS con i dati aggiornati fino allo Sprint 10.

Metrica	Valore misurato	Soglia accettabile	Esito
MPC-EV	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-PV	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-AC	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-CPI	0,995 (S10)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-SPI	1,000 (tutti gli <u>sprint</u> ^G)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-EAC	+0,5% dal BAC (S10)	$\pm 5\%$ dal BAC	Soddisfatta
MPC-ETC	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-TEAC	9,4 settimane (SPI = 1,000)	≥ 0	Soddisfatta
<u>MPC-IG</u> ^G	45,9 – 59,7 (non rimisurato in PB)	≥ 60	Da migliorare
MPC-CO	0 errori	0 errori	Soddisfatta
MPC-RSI	100% (S8-S10)	$\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-PRI	33,3% (fase PB, S8-S10)	$\leq 20\%$	Da migliorare
Metriche soddisfatte / Metriche misurate			10 / 12
MPC-QMS			83,3%

Tabella 28: Calcolo MPC-QMS — Periodo PB (aggiornato fino a S10)

Il QMS sale all'83,3% già a S8 e si mantiene su tale valore anche a S9 e S10, superando stabilmente la *soglia accettabile* dell'80% definita per questa metrica. Il miglioramento è determinato interamente dal rientro di MPC-EAC entro la soglia $\pm 5\%$ dal BAC, diretta conseguenza dell'azione di miglioramento sulla pianificazione^G avviata a fine RTB (Sezione 6), scostamento che a S10 si riduce ulteriormente allo +0,5%. Restano da migliorare due metriche:

- **MPC-PRI:** il valore resta al 33,3% nella fase PB (contro il 22,2% di fine RTB), invariato rispetto a S9 poiché a S10 non sono stati riscontrati né gestiti nuovi rischi; trattandosi però di una percentuale calcolata su soli 3 eventi rilevati in 3 sprint^G, il dato è ancora statisticamente poco robusto e verrà consolidato con l'accumularsi di ulteriori sprint^G. Le azioni di miglioramento sulla gestione dei rischi restano comunque prioritarie.
- **MPC-IG^G:** non ancora rimisurato in questa iterazione (si veda la Sezione 6); resta il valore rilevato in RTB.

5.6 Processi organizzativi — Gestione dei processi

5.6.1 MPC-TE — Time Efficiency

Requirements and Technology Baseline (RTB) Durante la fase RTB^G, il tracciamento orario si è concentrato esclusivamente sullo scostamento tra le ore previste e le ore effettivamente impiegate per il completamento dei task. Non è stata effettuata una misurazione granulare per distinguere le ore produttive da quelle di *overhead*. Pertanto, questa metrica risulta **N/A** per gli sprint^G S1-S7.

Azioni di miglioramento: Il team introdurrà un sistema di *time-tracking* granulare a partire dalla fase di Product Baseline^G (PB^G).

Product Baseline (PB) Le categorie di tracciamento proposte nella Sezione 6 (attività produttive, verifica, riunioni, studio, overhead) non sono state ancora applicate in modo sistematico alla rendicontazione oraria di S8, S9 e S10: il Piano di Progetto^G continua a registrare le ore per ruolo e task, ma senza la distinzione valore-aggiunto/overhead necessaria al calcolo. MPC-TE resta pertanto **N/A** anche per S8, S9 e S10. L'introduzione dello schema di categorizzazione è confermata come azione prioritaria per gli sprint^G successivi, in modo da avere la prima misurazione effettiva entro la Macro-fase 2.

5.6.2 MPC-PRI — Percentuale Rischi Inattesi

La metrica valuta la capacità del team di prevedere e mitigare i rischi. I dati sono stati estratti dalle retrospettive di tutti gli sprint^G di progetto.

<u>Sprint</u> ^G	Problema Emerso	Classificazione
S1	Difficoltà nell'apprendimento di nuovi tool grafici per il mock-up.	Previsto (RT1)
S2	Stallo per attesa file di esempio dal proponente ^G .	Previsto (RR1 / RO5)
S3	Sottostima del lavoro per diagrammazione e attività tecniche non preventivate.	Inatteso
S4	Blocco per attesa credenziali infrastruttura cloud AWS.	Inatteso
S5	Esito negativo revisione (semaforo rosso) a causa di errata interpretazione degli standard.	Previsto (RR2, RP2, RO3)
S6	Ristrutturazione AdR e PoC post revisione in tempi ristretti.	Previsto (RR2, RP2)
S7	Difficoltà di organizzazione del gruppo.	Previsto (RO2)

Tabella 29: Tracciamento dei rischi manifestati per sprint — Periodo RTB

Sprint^G	Rischi Totali	Rischi Inattesi	PRI (%)	Esito
Fase <u>RTB</u> ^G	10	2	20%	Da migliorare

Tabella 30: Calcolo MPC-PRI per la fase RTB

Requirements and Technology Baseline (RTB) Durante la fase RTB^G sono emersi 9 problemi principali. In seguito al semaforo rosso del quinto sprint, l'efficacia predittiva delle contromisure è aumentata e nell'ultimo sprint i rischi sono stati interamente gestiti tramite l'innalzamento preventivo dell'effort di verifica. Il valore PRI complessivo scende al 22,2%, vicino alla soglia desiderata del 20%.

Sprint^G	Problema Emerso	Classificazione
S8	Silenziò prolungato dell'azienda <u>proponente</u> ^G durante il periodo di ferie estive, con conseguente rallentamento dell'allineamento sui requisiti PB.	Previsto (RO5)
S8	Sottostima del carico di lavoro per la stesura delle Specifiche Tecniche rispetto al Manuale Utente.	Inatteso
S9	Blocco temporaneo nell'accesso ad alcuni modelli generativi per la creazione di immagini, dovuto a permessi non correttamente configurati.	Previsto (RT2)
S10	Nessun nuovo rischio riscontrato o gestito nel periodo.	—

Tabella 31: Tracciamento dei rischi manifestati per sprint — Periodo PB

Sprint^G	Rischi Totali	Rischi Inattesi	PRI (%)	Esito
Fase <u>PB</u> ^G (S8-S10)	3	1	33,3%	Da migliorare

Tabella 32: Calcolo MPC-PRI per la fase PB

Product Baseline (PB) Negli Sprint 8 e 9 sono emersi 3 problemi, con la stessa granularità di rilevazione già adottata in RTB (un evento per riga); lo Sprint 10 si è invece svolto senza intoppi di rilievo e non ha introdotto nuovi eventi. Due dei tre problemi sono stati ricondotti a rischi già presenti nel registro (RO5 per il silenzio del proponente^G, gestito tramite sollecito diretto; RT2 per il blocco sui modelli generativi, gestito tramite condivisione dei log di errore), mentre la sottostima del carico di lavoro documentale non era stata prevista. Il PRI di fase resta quindi al 33,3%, superiore sia alla soglia accettabile del 20% sia al 22,2% registrato in RTB; trattandosi tuttavia di una percentuale calcolata su un campione ancora ridotto (3 sprint^G, 3 eventi), il dato è statisticamente poco stabile e non implica di per sé un peggioramento della capacità predittiva del team, che anzi ha gestito entrambi i rischi previsti entro pochi giorni dalla loro comparsa e non ne ha registrati di nuovi nell'ultimo periodo. Il valore verrà monitorato nei prossimi sprint^G per verificarne la tendenza su un campione più ampio, in linea con l'azione di miglioramento sulla gestione dei rischi (Sezione 6).

5.6.3 MPC-LE — Labor Efficiency

Requirements and Technology Baseline (RTB) Come per la metrica MPC-TE, l'assenza di un tracciamento puntuale delle ore spese in attività a valore aggiunto rispetto al tempo totale lavorato (incluso overhead) rende impossibile il calcolo per la fase RTB^G. Il valore è quindi **N/A**. Le misurazioni inizieranno formalmente con la fase PB^G.

Product Baseline (PB) Per lo stesso motivo indicato per MPC-TE, il tracciamento granulare necessario al calcolo di MPC-LE non è stato ancora attivato negli Sprint 8, 9 e 10: il valore resta **N/A**. Come indicatore indiretto, il tasso di completamento ore preventivate/consuntivate resta comunque elevato in tutti e tre gli sprint^G (51/52 a S8, 59/62 a S9, 52/59 a S10), a conferma di un impiego del tempo complessivamente efficiente, pur non distinguendo ancora le ore a valore aggiunto da quelle di overhead richieste dalla definizione formale della metrica.

6 Iniziative di miglioramento

Le valutazioni riportate nel cruscotto di qualità evidenziano alcuni ambiti sui quali il gruppo è intervenuto a partire dalla fase PB^G. Il valore finale di MPC-QMS in RTB era pari al 75%, inferiore alla soglia accettabile, e segnalava la necessità di trasformare le criticità rilevate in azioni operative verificabili. Gli interventi descritti in questa sezione non introducono nuove metriche, ma utilizzano quelle già definite nel presente documento come riferimento per controllare l'efficacia delle correzioni. Lo storico delle azioni è mantenuto separato per periodo — RTB e PB — per non mescolare le criticità già chiuse con quelle emerse nella fase più recente.

Ambito	Evidenza rilevata in <u>RTB</u> ^G	Obiettivo per la fase <u>PB</u> ^G
<u>Pianificazione</u> ^G	MPC-EAC con EAC superiore al BAC.	Raffinare las stime e controllare con maggiore frequenza le previsioni a finire.
Gestione dei rischi	MPC-PRI con 2 rischi inattesi su 9 e valore pari al 22,2%.	Rendere più sistematica l'identificazione dei rischi tecnici, organizzativi ed esterni.
Qualità documentale	<u>MPC-IG</u> ^G sotto soglia per la leggibilità dei documenti.	Ridurre la densità testuale e migliorare la distinzione tra definizioni, motivazioni e conseguenze.
Tracciamento operativo	MPC-TE e MPC-LE non misurabili in <u>RTB</u> ^G per assenza di tracciamento granulare.	Distinguere le ore per tipologia di attività, ruolo, <u>sprint</u> ^G e <u>issue</u> ^G di riferimento.
Verifica e testing	MPC-CC e MPC-TSR non ancora misurabili su una baseline stabile di prodotto, da sviluppare in <u>PB</u> ^G .	Introdurre quality gate e tracciamento continuativo dei test a partire dai componenti stabilizzati.

Tabella 33: Storico delle azioni di miglioramento — Periodo RTB

Le azioni descritte nelle sottosezioni seguenti sono state definite a partire dagli esiti delle metriche e dalle evidenze emerse durante gli sprint^G RTB^G. Per ciascun ambito sono indicati la criticità rilevata, l'intervento previsto e il criterio con cui il gruppo intende verificarne l'efficacia nella fase successiva.

Negli Sprint 8, 9 e 10, primi tre sprint^G della fase PB^G, sono emerse ulteriori sfide organizzative e tecniche, distinte da quelle rilevate in RTB e riportate separatamente nella Tabella 34, per non confondere criticità già chiuse con quelle ancora aperte.

Ambito	Sfida riscontrata in <u>PB</u> ^G (S8-S10)	Trattamento ed esito
Comunicazione con il <u>proponente</u> ^G (organizzativo)	Silenzo prolungato dell'azienda durante il periodo di ferie estive, con rischio di rallentamento sull'allineamento dei requisiti PB (RO5).	Sollecito diretto tramite i canali di comunicazione forniti; risolto con la riunione esterna del 21/07/2026, che ha ripristinato l'allineamento sullo stack tecnologico e sulle priorità.
Stima del carico documentale (organizzativo)	Le Specifiche Tecniche si sono rivelate più corpose del Manuale Utente, comportando uno spostamento di parte del lavoro sui periodi successivi.	Lavoro ridistribuito sugli <u>sprint</u> ^G seguenti; a S10 il confronto ore preventivate/consuntivate già introdotto per MPC-EAC conferma il rientro (52 ore consuntivate su 59 preventivate).
Accesso a risorse tecnologiche esterne (tecnico)	Blocco temporaneo nell'accesso ad alcuni modelli generativi per la creazione di immagini, per permessi utente non correttamente configurati (RT2).	Condivisione tempestiva dei log di errore con l'azienda <u>proponente</u> ^G ; permessi ripristinati nel giro di pochi giorni, senza impatti significativi sullo sviluppo.
Migrazione della base di codice (tecnico)	Riorganizzazione di nomi di package, file e porzioni di codice ereditate dal PoC nella nuova repository dedicata all' <u>MVP</u> ^G .	Refactoring completato nello Sprint 8 entro le ore preventivate, senza impatti sugli <u>sprint</u> ^G successivi.
Consolidamento del processo (organizzativo)	A S10 non sono emerse nuove criticità: il periodo si è svolto senza intoppi di rilievo.	Conferma della solidità del processo di aggiornamento documentale e di sviluppo consolidato nei periodi precedenti; nessuna azione correttiva necessaria.

Tabella 34: Storico delle azioni di miglioramento — Periodo PB

6.1 Miglioramento della pianificazione e del controllo dei costi

Lo scostamento rilevato tramite MPC-EAC evidenzia che alcune attività sono state stimate con un livello di dettaglio non sufficiente rispetto all'impegno effettivo richiesto. La criticità riguarda in particolare le attività tecniche e documentali, che nella fase RTB^G hanno richiesto più tempo rispetto a quanto preventivato.

Aspetto	Criticità rilevata	Intervento previsto in <u>PB</u> ^G
Stima delle attività	Alcune attività sono state valutate in modo troppo aggregato, rendendo meno visibili dipendenze e sottoattività.	Scomporre le attività più ampie in task verificabili e associare a ciascuno una stima oraria più esplicita.
Controllo dello <u>sprint</u> ^G	Lo scostamento è emerso soprattutto a <u>consuntivo</u> ^G , quando l'impatto sul costo stimato a completamento era già visibile.	Confrontare a fine <u>sprint</u> ^G ore preventivate e consuntivate, motivando gli scostamenti principali.
Previsione a finire	L'EAC ha superato il BAC del 6,0% complessivo a fine periodo.	Aggiornare con maggiore frequenza le previsioni a finire, tenendo conto dei dati consuntivi più recenti.

Tabella 35: Azioni di miglioramento per MPC-EAC

Per evitare che il controllo dei costi resti limitato al solo consuntivo^G, il gruppo intende applicare un controllo regolare sulle stime ancora aperte. Tale controllo sarà svolto in corrispondenza della chiusura degli sprint^G e dovrà rendere esplicite le cause dello scostamento, distinguendo tra sottostima iniziale, attività non previste, dipendenze esterne e riallocazione delle risorse.

Criticità rilevata: MPC-EAC con EAC superiore al BAC.

Azione prevista: Confronto sistematico tra ore preventivate e ore consuntivate, con aggiornamento delle previsioni a finire sulla base degli scostamenti rilevati.

Metriche monitorate: MPC-EAC, con supporto delle metriche MPC-AC, MPC-CPI e MPC-ETC.

6.2 Miglioramento della gestione dei rischi

Il valore di MPC-PRI mostra una capacità di previsione dei rischi ancora incompleta. In RTB^G alcuni eventi sono stati gestiti nel corso dello sprint^G, ma non erano stati descritti in modo sufficientemente esplicito nel registro dei rischi. Per la fase PB^G il gruppo intende quindi rendere più puntuale la classificazione dei rischi e collegarla alle retrospettive.

Rischio^G emergente	Lettura del problema	Trattamento previsto
Attività tecniche sottostimate	Alcune attività implementative e di integrazione hanno richiesto approfondimenti non completamente previsti.	Esplicitare nel registro i rischi legati alla complessità tecnica e indicare una <u>mitigazione^G</u> tramite spike o task preliminari.
Attese per credenziali	L'accesso a risorse esterne può incidere direttamente sulla continuità delle attività tecniche.	Registrare le dipendenze da credenziali e ambienti esterni, indicando <u>responsabile^G</u> del sollecito e data limite interna.
Dipendenze esterne	File, servizi o informazioni provenienti dal proponente ^G possono introdurre ritardi non controllabili dal gruppo.	Associare alle dipendenze esterne un impatto previsto e una possibile attività alternativa in caso di blocco.

Tabella 36: Rischi da explicitare nel registro per la fase PB

L'aggiornamento del registro non sarà limitato all'aggiunta di nuove voci, ma dovrà migliorare la qualità informativa dei rischi già presenti. In particolare, durante le retrospettive il gruppo dovrà verificare se gli eventi emersi nello sprint^G erano stati previsti, se la mitigazione^G era applicabile e se l'impatto rilevato corrispondeva a quello stimato.

Criticità rilevata: MPC-PRI con presenza di rischi inattesi durante la fase RTB^G.

Azione prevista: Aggiornamento del registro rischi durante le retrospettive, indicando causa, impatto, mitigazione^G e responsabile^G per ciascun rischio^G significativo.

Metriche monitorate: MPC-PRI, con attenzione alla riduzione dei rischi inattesi e alla tempestività delle azioni di mitigazione^G.

6.3 Miglioramento della qualità documentale

L'indice di Gulpease^G sotto soglia non implica necessariamente la presenza di documenti errati, ma segnala una leggibilità inferiore a quella attesa. La criticità principale riguarda la densità dei periodi e l'uso frequente di terminologia tecnica, specialmente nelle sezioni in cui vengono motivate scelte architetturali o descritte metriche di controllo.

Aspetto documentale	Criticità rilevata	Criterio di revisione
Struttura dei periodi	Fraasi lunghe e ricche di incisi riducono la chiarezza, pur mantenendo corretto il contenuto.	Semplificare i periodi più densi e separare le informazioni che hanno funzione diversa.
Terminologia tecnica	Alcuni concetti vengono spiegati più volte all'interno dei documenti, aumentando la complessità di lettura.	Usare il <u>Glossario</u> ^G per alleggerire le spiegazioni ripetute e mantenere nei documenti solo il contesto necessario.
Organizzazione logica	Definizioni, motivazioni e conseguenze talvolta compaiono nello stesso paragrafo.	Distinguere meglio le parti descrittive da quelle valutative, così da rendere più immediata la consultazione.

Tabella 37: Azioni di miglioramento per la qualità documentale

Il miglioramento della leggibilità dovrà mantenere invariato il livello formale dei documenti. L'obiettivo non è ridurre il contenuto tecnico, ma renderlo più consultabile e meno concentrato in paragrafi estesi. Per questo motivo, nelle prossime revisioni sarà utile intervenire soprattutto sulle sezioni più dense, evitando riscritture generalizzate quando il testo risulta già chiaro e coerente.

Criticità rilevata: MPC-IG^G sotto soglia, con indice di Gulpease^G inferiore al valore accettabile previsto.

Azione prevista: Revisione mirata dei periodi più complessi, migliore separazione tra definizioni, motivazioni e conseguenze, uso più sistematico del Glossario^G.

Metriche monitorate: MPC-IG^G, verificando l'andamento dell'indice nelle revisioni successive dei documenti principali.

6.4 Miglioramento del tracciamento operativo

Le metriche MPC-TE e MPC-LE non sono state calcolabili in RTB^G perché il tracciamento orario non distingue ancora in modo sufficiente le diverse categorie di lavoro. Il gruppo ha registrato le ore necessarie al controllo dei costi, ma non ha separato con granularità adeguata attività produttive, verifica, riunioni, studio, overhead e blocchi.

Categoria	Descrizione operativa	Utilità per le metriche
Attività produttive	Sviluppo, documentazione, configurazione e attività direttamente collegate agli obiettivi dello <u>sprint</u> ^G .	Permette di stimare le ore a valore aggiunto necessarie per MPC-TE e MPC-LE.
Verifica	Revisione dei documenti, controllo del codice, validazione dei test e correzione dei difetti rilevati.	Consente di valutare il peso della verifica rispetto al lavoro complessivo.
Riunioni e coordinamento	Incontri interni, retrospettive, <u>pianificazione</u> ^G e coordinamento operativo tra membri del gruppo.	Rende visibile il tempo di organizzazione necessario al completamento delle attività.
Studio e approfondimento	Analisi di tecnologie, librerie, servizi esterni e strumenti necessari alla realizzazione della PoC o del prodotto.	Distingue il tempo di apprendimento dal tempo di produzione diretta.
Overhead e blocchi	Attese, problemi di accesso, dipendenze esterne e attività non produttive ma necessarie alla gestione del lavoro.	Permette di individuare le cause che riducono l'efficienza operativa.

Tabella 38: Categorie operative per il tracciamento delle ore in PB

La rendicontazione prevista per PB^G dovrà collegare ogni registrazione allo sprint^G, all'issue^G di riferimento, al ruolo coinvolto, alle ore preventivate e alle ore effettive. Questo consentirà di analizzare gli scostamenti non solo a livello complessivo, ma anche per tipologia di attività e per responsabilità operative.

Criticità rilevata: MPC-TE e MPC-LE non misurabili in RTB^G per mancanza di tracciamento granulare.

Azione prevista: Introduzione di una rendicontazione collegata a sprint^G, issue^G, ruolo, categoria dell'attività, ore preventivate e ore effettive.

Metriche monitorate: MPC-TE e MPC-LE, con supporto dei dati consuntivi utilizzati anche per il controllo di MPC-EAC.

6.5 Miglioramento della verifica e del testing

Durante la fase RTB^G molti test risultano ancora NI o non pienamente misurabili, poiché la PoC ha avuto finalità dimostrativa e ha consentito di verificare la fattibilità dei flussi principali. La baseline stabile di prodotto verrà sviluppata e consolidata nella fase PB^G, prendendo come riferimento lo stack effettivamente adottato: Laravel^G con vista

SPA React/TypeScript in cloud distribuito, escludendo le tecnologie scartate durante le iterazioni di rafforzamento della PoC.

Flusso principale	Aspetto da consolidare	Controllo previsto
Caricamento PDF	Validazione del formato, gestione degli errori e tracciamento dell'esito del caricamento.	Test automatici sui casi validi e sui casi di errore più significativi.
Salvataggio documenti	Persistenza dei dati generati e recupero corretto delle informazioni associate.	Verifica di creazione, aggiornamento e recupero dei documenti salvati.
Elaborazione asincrona	Esecuzione tramite worker e coda cloud (Amazon SQS), con gestione degli stati intermedi.	Test sui passaggi di stato e sui casi di elaborazione fallita o ritentata.
Integrazione con AWS S3	Gestione dei file e coerenza tra <u>metadati</u> ^G applicativi e oggetti salvati.	Controlli su caricamento, lettura e assenza di riferimenti non validi.
Uso di Amazon Bedrock	Stabilità delle chiamate per generazione contenuti, classificazione e split automatico.	Verifica dei percorsi alternativi e della corretta segnalazione degli errori infrastrutturali.
Generazione dei contenuti	Produzione e salvataggio dei contenuti generati a partire dai dati estratti.	Test sui risultati attesi e sulle condizioni in cui i dati di partenza sono incompleti.

Tabella 39: Flussi da consolidare nel processo di verifica PB

In PB^G il gruppo intende collegare il tracciamento dei test ai quality gate automatici, così che gli esiti non restino informazioni isolate. Il consolidamento dovrà riguardare sia i test che verificano il comportamento applicativo, sia i controlli di integrazione sui servizi previsti dalla baseline di riferimento cloud.

Criticità rilevata: MPC-CC e MPC-TSR non ancora pienamente applicabili in RTB^G, poiché la baseline stabile di prodotto verrà sviluppata e consolidata in PB^G.

Azione prevista: Consolidamento dei quality gate automatici e tracciamento degli esiti dei test sui flussi principali del prodotto.

Metriche monitorate: MPC-CC e MPC-TSR, da misurare in modo sistematico dopo il consolidamento dei componenti principali.

Sintesi conclusiva: Le iniziative descritte hanno lo scopo di trasformare le criticità emerse durante la fase RTB^G in azioni operative per la fase PB^G. In particolare, il gruppo intende migliorare la precisione della pianificazione^G, rendere più sistematica la gestione dei rischi, aumentare la qualità della documentazione e consolidare il processo di verifica del codice. Tali interventi saranno monitorati attraverso le metriche già definite

nel presente documento, con particolare attenzione a MPC-EAC, MPC-PRI, MPC-IG^G, MPC-TE, MPC-LE, MPC-CC e MPC-TSR.

A tre sprint^G dall'avvio della fase PB^G, un primo bilancio delle azioni intraprese mostra risultati contrastanti. L'azione sulla pianificazione^G ha prodotto un esito positivo e immediatamente misurabile: MPC-EAC è rientrato entro la *soglia ottimale* $\pm 5\%$ già a S8 e si è ulteriormente consolidato a S10 (+0,5% dal BAC), portando e mantenendo MPC-QMS dal 75% dell'RTB all'83,3% della PB in tutti e tre gli sprint^G osservati. L'azione sulla gestione dei rischi è invece ancora in fase di consolidamento: MPC-PRI resta al 33,3% nella fase PB — invariato dopo che S10 non ha registrato nuovi eventi — seppur su un campione ancora limitato a 3 sprint^G. Le azioni su qualità documentale, tracciamento operativo e verifica/testing non hanno ancora prodotto misurazioni aggiornate — rispettivamente perché i documenti non sono stati oggetto di un nuovo ciclo completo di revisione, perché lo schema di categorizzazione delle ore non è ancora stato applicato in modo sistematico e perché la baseline di codice stabile è ancora in fase di costruzione (Macro-fase 2) — e restano pertanto priorità aperte per i prossimi sprint^G della fase PB^G.
