aLittleByte

alittlebyte.swe@gmail.com

Dichiarazione Impegni

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Angela Maule, Eleonora Bellet
Verificatori	
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
1.2	2026-03-11	Stesura sezione 3 (Preventivo costi)	Angela Maule	-	-
1.1	2026-03-10	Stesura sezione 2 (Impegno orario e Ruoli)	A. Maule, E. Bellet	-	-
1.0	2026-03-09	Struttura del documento e Introduzione	Eleonora Bellet	-	-

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Finalità del documento 2

2 Impegno orario e Ruoli **2**
2.1 Distribuzione ore per ruolo 2
2.2 Analisi dei Ruoli 2
2.2.1 Responsabile 2
2.2.2 Amministratore 3
2.2.3 Progettista 3
2.2.4 Analista 3
2.2.5 Verificatore 3
2.2.6 Programmatore 3
2.3 Motivazione suddivisione oraria 3

3 Preventivo costi **4**
3.1 Costo per ruolo 4
3.2 Costo totale preventivato 4

4 Mitigazione dei rischi **5**

5 Consegna **5**

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Con il seguente documento, il gruppo aLittleByte (Gruppo 19) di Ingegneria del Software dichiara l'impegno orario preventivato per l'implementazione del capitolato C5 - Nexum, proposto da Eggon, confermando la propria candidatura per la sua realizzazione. Nel documento sono riportati: la descrizione dei ruoli previsti per lo svolgimento del progetto, il monte ore assegnato a ciascun componente e il preventivo economico totale.

2 Impegno orario e Ruoli

2.1 Distribuzione ore per ruolo

Componente	**Re**	**Am**	**An**	**Pj**	**Pr**	**Ve**	**Totale**
Eleonora Bellet	8	7	8	20	23	24	**90**
Diego Belluz	8	7	9	21	23	22	**90**
Angelica Gastaldello	8	7	9	21	22	23	**90**
Vinicius Yuri Kaneda Fernandes	8	8	8	20	23	23	**90**
Angela Maule	8	8	8	21	23	22	**90**
Alex Oloni	8	8	9	20	23	23	**90**
Leonardo Soligo	8	7	9	20	23	23	**90**
Totale Ore	**56**	**51**	**60**	**143**	**160**	**160**	**630**

Tabella 1: Ore di ogni componente per ciascun ruolo

Legenda: Re: Responsabile, **Am**: Amministratore, **An**: Analista, **Pj**: Progettista, **Pr**: Programmatore, **Ve**: Verificatore.

2.2 Analisi dei Ruoli

2.2.1 Responsabile

Il responsabile coordina le attività e gestisce le comunicazioni con i docenti e l'azienda proponente (Eggon). Si occupa della pianificazione temporale, del monitoraggio dell'avanzamento, assicurandosi che la rotazione dei ruoli avvenga in modo corretto. Ha inoltre il compito di definire e far rispettare le *Norme di Progetto* e le linee guida di sviluppo. È una figura presente durante l'intero ciclo di vita del software, ma il suo impegno è particolarmente intensivo nelle fasi iniziali, per poi diminuire progressivamente man mano che il team acquisisce autonomia operativa. Essendo il ruolo economicamente più oneroso, il suo monte ore è stato ottimizzato per garantire efficienza senza gravare eccessivamente sul preventivo finale.

2.2.2 Amministratore

Ha il compito di predisporre e preservare l'ecosistema tecnologico di supporto al team, garantendo la piena operatività delle infrastrutture IT e degli strumenti di collaborazione. Promuove l'efficienza del gruppo integrando processi automatizzati, come la validazione continua e l'esecuzione dei test. Trattandosi di una figura focalizzata in larga parte sul setup iniziale e sul monitoraggio dei sistemi, l'impegno orario a preventivo risulta tra i più contenuti dell'intero progetto.

2.2.3 Progettista

Ha il compito di definire l'architettura del sistema a partire dai requisiti concordati, selezionando le tecnologie più idonee per la sua realizzazione. Produce inoltre una documentazione chiara ed esaustiva, fondamentale per guidare i programmatori nella successiva fase di codifica. Poiché eventuali imprecisioni progettuali avrebbero gravi ripercussioni sull'intero sviluppo del prodotto, a questo ruolo è stato assegnato un monte ore particolarmente elevato per garantirne la massima cura.

2.2.4 Analista

La figura dell'analista è incaricata di studiare e analizzare i requisiti di sistema. Analizza a fondo il capitolato d'appalto, si confronta direttamente con il proponente e traduce le necessità emerse in chiare specifiche e modelli di casi d'uso. Il suo lavoro si concentra soprattutto all'avvio del progetto, ma resta un punto di riferimento fondamentale per adattare e far evolvere i requisiti durante tutto il processo di lavoro.

2.2.5 Verificatore

La figura del verificatore ha il compito di certificare la correttezza e la qualità del prodotto finale. È una presenza costante in ogni fase dello sviluppo, impegnata a validare i rilasci e a garantire che tutto il materiale prodotto rispetti i requisiti stabiliti. Le mansioni includono testing, revisione puntuale del codice e controllo di conformità della documentazione rispetto agli standard.

2.2.6 Programmatore

Il programmatore è la figura operativa per eccellenza. Si occupa della stesura del codice in linea con gli standard di settore. Si fa carico di assemblare i componenti del sistema, documentarne il funzionamento e garantirne l'affidabilità fin dalle basi tramite i test unitari. Il suo intervento è richiesto in maniera continuativa per tutta la durata delle fasi di realizzazione e manutenzione.

2.3 Motivazione suddivisione oraria

Il preventivo orario complessivo di 630 ore è stato suddiviso assegnando a ciascun membro un impegno di 90 ore produttive. Per assicurare una crescita professionale completa, il gruppo ha pianificato una rotazione dei ruoli ogni due settimane (DA SENTIRE

AZIENDA per allinearsi in modo naturale agli sprint concordati con l'azienda proponente.) Osservando la distribuzione: il nucleo centrale del lavoro è stato posto sulle figure tecniche. In particolare, si è deciso di assegnare un peso esattamente identico alla stesura del codice (Programmatore, 160 ore) e al controllo qualità (Verificatore, 160 ore). Questa specularità nasce dalla volontà di non relegare il testing a una fase secondaria, ma di farlo procedere di pari passo con lo sviluppo.
Una parte importante del preventivo (143 ore) è stata assegnata al Progettista. L'obiettivo è creare da subito una base solida: investire tempo in una buona architettura e in una documentazione chiara facilita il lavoro dei programmatori e riduce il rischio di dover correggere gravi errori in futuro.
Di conseguenza, le ore per l'Analista (60), il Responsabile (56) e l'Amministratore (51) sono state mantenute volutamente più basse. Non si tratta di ruoli meno importanti, ma di una scelta per ottimizzare i costi: poiché il loro lavoro si concentra soprattutto all'inizio del progetto o in attività di controllo periodico, assegnare loro meno ore ci permette di contenere il preventivo e dedicare più risorse allo sviluppo vero e proprio del software.

3 Preventivo costi

3.1 Costo per ruolo

Ruolo	**Costo Orario (€/h)**	**Ore**	**Costo (€)**
Responsabile	30€/h	56h	1.680€
Amministratore	20€/h	51h	1.020€
Analista	25€/h	60h	1.500€
Progettista	25€/h	143h	3.575€
Programmatore	15€/h	160h	2.400€
Verificatore	15€/h	160h	2.400€
Totale		**630**	**12.575€**

Tabella 2: Riassunto dei costi derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo

3.2 Costo totale preventivato

Il costo totale previsto per la realizzazione del progetto è di 12.575€.

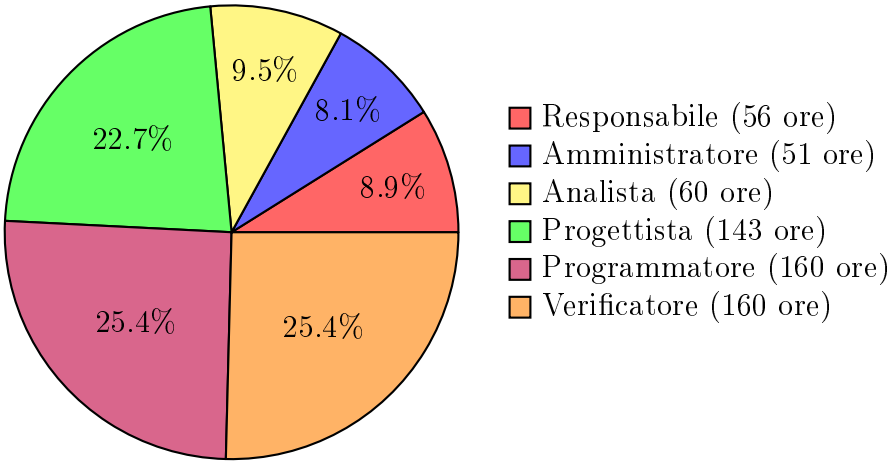

Figura 1: Ripartizione in percentuale del monte ore totale

4 Mitigazione dei rischi

Per assicurarci di non superare il budget di 12.575€, il gruppo ha pianificato la gestione dei rischi concentrandosi sull'efficienza operativa. Come già citato in precedenza, la scelta di bilanciare esattamente le ore di programmazione e di verifica (160 ore ciascuna) serve a evitare che eventuali errori scoperti in ritardo portino a un aumento imprevisto dei costi nelle fasi finali del progetto. Inoltre, la rotazione dei ruoli ogni due settimane è supportata da un rigoroso obbligo di documentazione; grazie a ciò ogni membro del gruppo avrà le competenze necessarie per supportare gli altri durante i cambi di turno, garantendo che l'investimento orario rimanga produttivo e aderente al preventivo stabilito. Tale approccio mira a evitare ritardi nella consegna fissata finale del progetto e la necessità di aggiungere ore extra non preventivate.

5 Consegna

La data ultima per la consegna del progetto è fissata improrogabilmente al giorno 10 settembre 2026.
